

MUNICIPIO DE CABORCA
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA

OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS PINTURA Y REHABILITACION ELECTRICA EN ESCUELA
TELESECUNDARIA No 289 EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

NO. DE CONTRATO: CAB-CMCP-26-2017
FECHA: 12/ENERO/2017
MONTOS/IVA: \$ 210,026.12

ANTICIPO S/IVA: \$ 63,007.83

TIPO DE INVERSION:

LOCALIDAD: CABORCA
MUNICIPIO: H. CABORCA

CONCEPTO: OBRA NORMAL
POR OBRA EJECUTADA:
DE: 07/FEB/2017
AL: 08/MAR/2017

FECHAS		AVANCE	
INICIO	TERMINO	FISICO	FINANCIERO
12/01/17	8/03/17	100.00%	59.82%

FECHA: 14/MAR/2017
ESTIMACION No. 2 (DOS) FINIQUITO

ESTADO DE CUENTA DE ANTICIPO	
(NO INCLUYE IVA)	
AMORTIZ. ACUM. ANTERIOR	\$ 36,162.37
AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACION	\$ 26,845.46
AMORTIZADO TOTAL	\$ 63,007.83
ANTICIPO OTORGADO	\$ 63,007.83
SALDO	\$ 0.00

IMPORTE ESTIMACION	\$ 89,484.89
AMORT. ANTICIPO	\$ 26,845.46
SUBTOTAL	\$ 62,639.43
IVA	\$ 10,022.31
TOTAL	\$ 72,661.74
DEDUCCIONES	
0.2% I.C.I.C.	\$ 178.97
0.2% INSP. Y VIG.	\$ 178.97
0.02% UNISON	\$ 17.90
0.03% CECOP	\$ 26.85

SUMA DE DEDUCCIONES: \$ 402.69

BUENO POR \$ 72,259.05

ESTADO DE CUENTA DE CONTRATO	
ESTA ESTIMACION	\$ 89,484.89
ACUM. ANTERIOR	\$ 120,541.23
ACUM TOTAL	\$ 210,026.12
MONTO ASIGNADO AL CONTRATO	\$ 210,026.12
SALDO	\$ -

ELABORADA		REVISADA	
CONTRATISTA		H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA	
ING. JOAQUIN MENDEZ ELIAS		SUPERVISOR	
COORDINADOR DE CMCP		PRESIDENTE MUNICIPAL	
LIC. LUIS ARTURO ORTEGA DUENAS		Q.B KARINA GARCIA GUTIERREZ	
SECRETARIO MUNICIPAL			
ING. RICARDO ARAIZA CELAYA			
APROBACION			

OBRA:	CONSTRUCCION DE BAÑOS PINTURA Y REHABILITACION ELECTRICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA No 289 EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	UBICACIÓN:	MUNICIPIO DE CABORCA	ESTIM.:	2 (DOS) FINIQUITO
		LOCALIDAD:	CABORCA	FECHA:	14/MAR/2017

GENERADOR DE OBRA							
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	ENTRE AVENIDAS/CALLES	LARGO	ANCHO	ALTO/PROF	PZAS.
1	Limpia, trazo y nivelacion del terreno	m2					
2	Excavacion a mano en material tipo "B" hasta una profundidad de 1.50 m.	m3					
3	Planilla de concreto simple de 5 cm de espesor para alojar zapata corrida	m1					
4	Zapata corrida armada con 4 vs. De 3/8" y estribos de 3/8" @ 20 cm, concreto f'c= 200 kg/cm2	m1					
5	Block para dar altura relleno de concreto simple	m1					
6	Castillos de 15 x 20 armado con vs. De 3/8" y estribos de 1/4 @ 25 cm, concreto f'c= 200 kg/cm2	m1					
7	Muro de ladrillo comun juntado con mortero cemento arena	m2					
8	Losa de concreto de 10 cm de espesor aramada con vs. De 3/8" @ 20 cm ambos sentidos y concreto f'c=250 kg/cm2	M2					
9	Piso de concreto de 10 cm de espesor reforzado con malla electrosoldada TMA de 3/4"	m2					
10	Banqueta perimetral hecha de concreto reforzado con malla electrosoldada y concreto f'c= 200 kg/cm2	M2					
11	Enjarre grueso en muros interiores y exteriores a base de mortero arena cemento	m2					
12	Enjarre fino en muros interiores y exteriores a base de mortero arena cemento	m2					
13	Acabado en losa a base de yeso	m2					

CONSTRUCCION DE BAÑOS PINTURA Y REHABILITACION
ELECTRICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA No 289 EN
LA COMUNIDAD DEL EJIDO JOSEFA ORTIZ DE
DOMINGUEZ

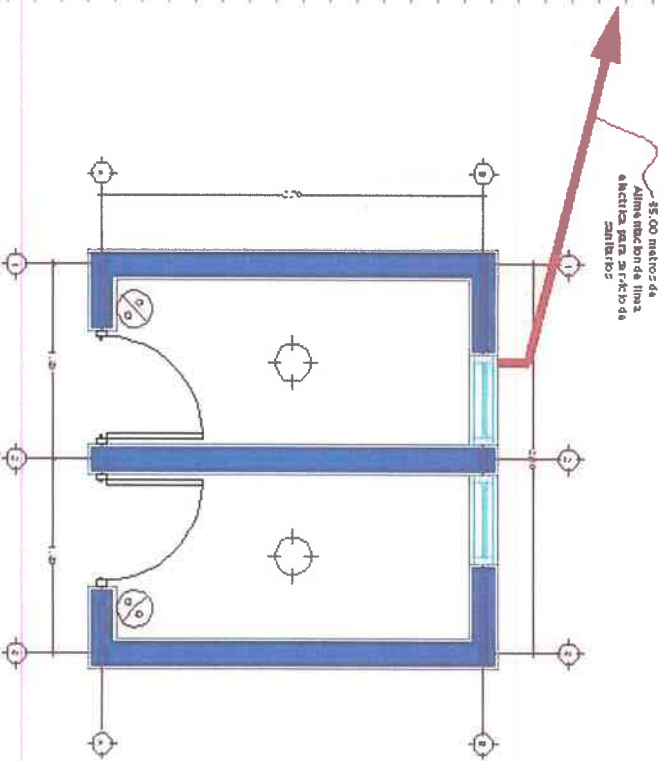
ESTIM.: 2 (DOS) FINIQUITO
FECHA: 14/MAR/2017

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	ENTRE AVENIDAS/CALLES	LARGO	ANCHO	ALTO/PROF	PZAS.	CANTIDAD
-------	----------	--------	-----------------------	-------	-------	-----------	-------	----------

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	ENTRE AVENIDAS/CALLES	LARGO	ANCHO	ALTO/PROF	PZAS.	CANTIDAD
	<p>35.00 metros de línea eléctrica para el punto de sanitarios</p>							
21	Rehabilitación de red eléctrica en aula	lote					1.00	1.00
22	Instalación hidráulica y sanitaria en baños	lote					1.00	1.00
23	Limpieza general de obra	LOTE					1.00	1.00

OBRA:	CONSTRUCCION DE BAÑOS PINTURA Y REHABILITACION ELECTRICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA No 289 EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	UBICACION:	MUNICIPIO DE CABORCA	ESTIM.:	2 (DOS) FINIQUITO
		LOCALIDAD:	CABORCA	FECHA:	14/MAR/2017

GENERADOR DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	ENTRE AVENIDAS/CALLES	LARGO	ANCHO	ALTO/PROF	PZAS.	CANTIDAD
				35.00			1.00	35.00
21	Rehabilitacion de red electrica en aula	lote					1.00	1.00
22	Instalacion hidraulica y sanitaria en baños	lote					1.00	1.00
23	Lim pieza general de obra	LOTE					1.00	1.00

OBRA:	CONSTRUCCION DE BAÑOS PINTURA Y REHABILITACION ELECTRICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA No 289 EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	ESTIM.: 2 (DOS) FINQUITO
	UBICACIÓN: MUNICIPIO DE CABORCA LOCALIDAD: CABORCA	FECHA: 14/MAR/2017

GENERADOR DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	ENTRE AVENDAS/CALLES	LARGO	ANCHO	ALTO/PROF	PZAS.	CANTIDAD
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> ING. JOAQUIN MENDEZ ELIAS CONTRATISTA </div> <div> SUPERVISOR </div> </div>								

MUNICIPIO DE CABORCA

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA

OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS PINTURA Y REHABILITACION
ELECTRICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA No 289 EN LA
COMUNIDAD DEL EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

IMPORTE DEL CONTRATO:
\$210,026.12

UBICACION:
LOCALIDAD:

MUNICIPIO DE CABORCA
CABORCA

DESGLOSE DE ESTIMACION

MONTO ESTA ESTIMACION:
\$89,484.89

POR OBRA EJECUTADA:
07/FEB/2017

ESTIMACION: 2 (DOS) FINIQUITO
FECHA: 14/MAR/2017

No	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PPTO	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	ESTA ESTIM.	P.U	TOTAL
1	Limpia, trazo y nivelacion del terreno	m2	7.02	7.02	7.02	0.00	18.00	0.00
2	Excavacion a mano en material tipo "B" hasta una profundidad de 1.50 m.	m3	6.38	6.38	6.38	0.00	220.00	0.00
3	Plantilla de concreto simple de 5 cm de espesor para alojar zapata corrida	ml	13.30	13.30	13.30	0.00	190.00	0.00
4	Zapata corrida armada con 4 vs. De 3/8" y estribos de 3/8" @ 20 cm, concreto f'c= 200 kg/cm2	ml	13.30	13.30	13.30	0.00	690.00	-
5	Block para dar altura relleno de concreto simple	ml	13.30	13.30	13.30	0.00	485.00	0.00
6	Castillos de 15 x 20 armado con vs. De 3/8" y estribos dealambreon de 1/4 @ 25 cm,concreto f'c= 200 kg/cm2	ml	19.20	19.20	19.20	0.00	525.00	0.00
7	Muro de ladrillo comun juntado con mortero cemento arena	m2	30.00	30.00	30.00	0.00	525.00	0.00
8	Losa de concreto de 10 cm de espesor aramada con vs. De 3/8" @ 20 cm ambos sentidos y concreto f'c=250 kg/cm2	M2	10.56	10.56	10.56	0.00	635.00	0.00
9	Piso de concreto de 10 cm de espesor reforzado con malla electrosoldada TMA de 3/4"	m2	5.86	5.86	5.86	0.00	550.00	0.00
10	Banqueta perimetral hecha de concreto reforzado con malla electrosoldada y concreto f'c= 200 kg/cm2	M2	2.60	2.60	2.60	0.00	585.00	0.00
11	Enjarre grueso en muros interiores y exteriores a base de mortero arena cemento	m2	69.16	69.16	69.16	0.00	320.00	0.00
12	Enjarre fino en muros interiores y exteriores a base de mortero arena cemento	m2	69.16	69.16	69.16	0.00	235.00	0.00
13	Acabado en losa a base de yeso	m2	10.56	10.56	10.56	0.00	250.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA

OBRA:

\$210,026.12

LOCALIDAD:

CABORCA

\$89,484.89

07/FEB/2017

FECHA: 2017

14/MAR/2017

[illegible]

CONTRATISTA

ING. JOAQUIN MENDEZ ELIAS

POR EL MUNICIPIO DE CABORCA

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LUIS ARTURO ORTEGA DUEÑAS

ING. RICARDO ARAIZA CELAYA

Q.B KARINA GARCIA GUTIERREZ
