

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA

RECIBO DE ESTIMACIONES



OBRA :		TERMINACION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO FRENTE A ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON LOCALIDAD LIDO ALVARO OBREGON, MUNICIPIO DE OBRA NORMAL		FECHA: 18/10/2016		UBICACION: CABORCA, SONORA		POR OBRA EJECUTADA:	
CONCEPTO:		ESTIMACION No. 2		RECIBIMOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE CABORCA, SONORA LA CANTIDAD DE : \$ 46,846.32		FINANCIERO		DE : 21/09/2016	
NO. DE CONTRATO		FECHA		IMPORTE S/IVA		ANTICIPO S/IVA		INICIO	
CMCOP-15-2016		15/08/2016		\$ 227,832.50		\$ 68,349.75		15/08/2016	
								TERMINO	
								17/10/2016	
								FISICO	
								100%	
								FINANCIERO	
								122%	
								TIPO DE INVERSION	
								FIANZA DE ANTICIPO No. :	
								0	
								FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. :	
								0	

ESTADO DE CUENTA DE ANTICIPO (NO INCLUYE IVA)	
AMORTIZ. ACUM. ANTERIOR	\$ 0.00
AMORTIZ. EN ESTA ESTIMACION	\$ 17,404.21
AMORTIZADO TOTAL	\$ 17,404.21
ANTICIPO OTORGADO	\$ 68,349.75
SALDO	\$ 50,945.54

LIQUIDACION	
IMPORTE ESTIMACION	\$ 58,014.02
AMORT. ANTICIPO	\$ 17,404.21
SUBTOTAL	\$ 40,609.81
IVA	\$ 6,497.57
TOTAL	\$ 47,107.38
DEDUCCIONES	
I.C.I.C. .2 %	\$ 116.03
INSP. Y VIGILANCIA .2 %	\$ 116.03
UNISON 10 % (S.I.V.)	\$ 11.60
CECOP 15 % (S.I.V.)	\$ 17.40
SUMA DE DEDUCCIONES	\$ 261.06

ESTADO DE CUENTA DE CONTRATO (NO INCLUYE I.V.A.)	
ESTA ESTIMACION	\$ 58,014.02
ACUM. ANTERIOR	\$ 169,818.48
ACUM. TOTAL	\$ 227,832.50
MONTO ASIGNADO AL CONTRATO	\$ 227,832.50
SALDO	\$ 0.00

BUENO POR 46,846.32

FORMULARON	APROBARON
EL CONTRATISTA	SUPERVISOR
	
C. SAMUEL MURRIETA BELARANO	C. LUIS ARTURO ORTEGA DUENAS
C. DULCE ALEJANDRA MARILES GUERRERO	C. Q.B. KARINA GARCIA GUTIERREZ
COORDINADOR CMCOP	PRESIDENTA MUNICIPAL

TIPO DE OBRA DE LA ESTIMACION

FT16

OBRA : TERMINACION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO FRENTE A ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON LOCALIDAD IJIDO ALVARO OBREGON, MUNICIPIO DE		ESTIMACION N° 2	RECEBIMOS DEL :	LA CANTIDAD DE: \$46,846.32
FECHA : 18 de octubre de 2016 UBICACIÓN : CABORCA, SONORA		CONCEPTO: OBRA NORMAL		
DEL: 21/09/2016 AL: 17/10/2016		POR OBRA EJECUTADA :		

No.	TIPO DE TRABAJO	IMPORTE	OBSERVACIONES
	SUBTOTAL HOJA 1 \$	53,265.08	
	SUBTOTAL HOJA 2 \$	-	
	SUBTOTAL HOJA 3 \$	4,748.94	
	SUMA \$	58,014.02	

IMPORTE DE OBRA : 58,014.02	AMORTIZACION DE ANTICPO : 17,404.21	SUBTOTAL : 40,609.81	
DEDUCCIONES	L.V.A. 6,497.57	116.03	
I.C.I.C. 2 %	116.03	116.03	
INSP. Y VIGILANCIA 2 %	116.03	116.03	
UNISON 10 % (S.I.V.)	11.60	11.60	
CECOP 15 % (S.I.V.)	17.40	17.40	
ALCANCE LIQUIDO :	46,846.32		

FORMULARON

SUPERVISOR C. DULCE ALEJANDRA MARILES GUERRERO

CONTRATISTA C. SAMUEL MURRIETA BEJARANO

APROBARON

COORDINADOR CM COP C. LUIS ARTURO ORTEGA DUEÑAS

PRESIDENTA MUNICIPAL Q.B. KARINA GARCIA GUTIERREZ

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

FT17

OBRA : TERMINACION DE CANGCHA MULTIFUNCIONAL UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO FRENTE A ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON LOCALIDAD UJIDO ALVARO OBREGON, MUNICIPIO DE CABORCA SONORA		FECHA : 18/10/2016	POR OBRA EJECUTADA :
CONCEPTO : OBRA NORMAL		UBICACION : CABORCA, SONORA	DE : 21/09/2016 A: 17/10/2016
Nº DE CONTRATO	FECHA	IMPORTE S/IVA	ESTIMACION Nº
CMCOP-15-2016	15/08/2016	\$227,832.50	2
		\$68,349.75	15/08/2016
			17/10/2016
			IMPORTE DE ESTIMACION : \$
			FISCO 100%
			FINANCIERO 122%
			TIPO DE INVERSION ESTATAL
			58,014.02

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PRESUPUESTO	CANTIDADES DE OBRA			P. UNITARIO	IMPORTE	
				ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION			
1	DADO DE CONCRETO DE SECCION 20X20 C. DE ALTURA VARIABLE, PARA COLOCACION DE ESTRUCTURA DE GRADAS CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DE 1/2" Y ESTRIBOS CON VARILLA DE 1/4" @ 20 CM, CIMBRA COMUN, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, COLADO, VIBRADO, CURADO Y DESCIMBRA, INCLUYE GANCHOS, ESCUADRAS, CRUCES Y DESPERDICIOS.	PZA	4.00	0.00	0.00	1,342.90	\$	-	
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO DE SECCION 20X20CM DE 3/8" DE ESPESOR PARA RECIBIR ESTRUCTURA DE PORTERIA Y GRADAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.00	0.00	0.00	1,201.26	\$	-	
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE PORTERIA A BASE DE TUBO ESTRUCTURAL DE 3" DE 3.0 X 2.08 , ANCLAJE A LOSA.; DE ALTA RESISTENCIA O SIMILARES, AROS METALICOS REGLAMENTARIOS CON RED.	PZA	2.00	2.00	0.00	26,632.54	\$	53,265.08	
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO PARA ALUMBRADO DE 8 MTS, INCLUYE: OPSTE, BASE DE CONCRETO, CRUCETA, 2 LAMPARAS DE ADITIVO METALICO DE 1000w, CABLEADO EN EL INTERIOR DEL POSTE Y EN LAS LAMPARAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	4.00	0.00	0.00	19,975.41	\$	-	
CONTRATISTA							SUPERVISOR		
MURRIETA SOLUCIONES S.A. DE C.V.							C. DULCE ALEJANDRA MARILES GUERRERO		
PRESIDENTE MUNICIPAL							COORDINADOR CMCOP CABORCA		
Q.B. KARINA GARCIA GUTIERREZ							C. LUIS ARTURO ORTEGA DUEÑAS		
							ESTA HOJA	\$	53,265.08

POR EL MUNICIPIO DE CABORCA

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

FT17

OBRA : TERMINACION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO FRENTE A ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON LOCALIDAD JUDDO ALVARO OBREGON, MUNICIPIO DE CABORCA SONORA	FECHA : 18/10/2016	UBICACION : CABORCA, SONORA	DE : 21/09/2016	A : 17/10/2016	POR OBRA EJECUTADA :			
CONCEPTO : OBRA NORMAL	ESTIMACION N° 2	IMPORTE DE ESTIMACION : \$						
N° DE CONTRATO	FECHA	IMPORTE S/IVA	ANTICIPO S/IVA	INICIO	TERMINO	FISICO	FINANCIERO	TIPO DE INVERSION
CMCOP-15-2016	15/08/2016	\$227,832.50	\$68,349.75	15/08/2016	17/10/2016	100%	122%	ESTATAL
CANTIDADES DE OBRA								

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	P. UNITARIO	IMPORTE
8	FABRICACION DE BANCA DE 1.60 MTS DE LARGO A BASE ASIEN TO DE LOSA DE CONCRETO DE 0.40 MTS DE ANCHO Y 10 CM DE ESPESOR, DESPLANTADA SOBRE ZAPATA CORRIDA DE 0.40 MTS DE ANCHO Y 0.15 CM DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8, MUERETE DE BLOCK REFORZADO CON VAR VERTICALES DE 3/8 Y CELDAS COLADAS CON CONCRETO, MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	4.00	0.00	0.00	1.00	6,806.03	\$
9	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA	LOTE	1.00	1.00	0.00	1.00	4,748.94	\$


CONTRATISTA	SUPERVISOR
MURRIETA SOLUCIONES S.A. DE C.V.	C. DULCE ALEJANDRA MARILES GUERRERO
ESTEA HOJA	\$
4,748.94	4,748.94

PRESIDENTE MUNICIPAL	POR EL MUNICIPIO DE CABORCA	COORDINADOR CMCOP CABORCA
Q.B. KARINA GARCIA GUTIERREZ	Q.B. KARINA GARCIA GUTIERREZ	C. LUIS ARTURO ORTEGA DUENAS

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO N° CMCOP-15-2016		TERMINACION DE CANCHA MUJERES NACIONAL	FECHA 18 de octubre de 2016
UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO FRENTE A		ESTIMACION N° 2	PERIODO DE ESTIMACION
ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON LOCALIDAD		DEL 15/08/2016 AL 17/10/2016	
UBICACION: CABORCA, SONORA			

CLAVE	CONCEPTOS EJECUTADOS	EJE	ENTRE	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	PZAS.	CARAS	OBSERVACIONES	TOTAL	UNIDAD
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE PORTERIA A BASE DE TUBO ESTRUCTURAL DE 3" DE 3.0 X 2.08, ANCLAJE A LOSA, DE ALTA RESISTENCIA O SIMILARES, AROS METALICOS REGLAMENTARIOS CON RED.						2			2.00	
TOTAL										2.00	PZA

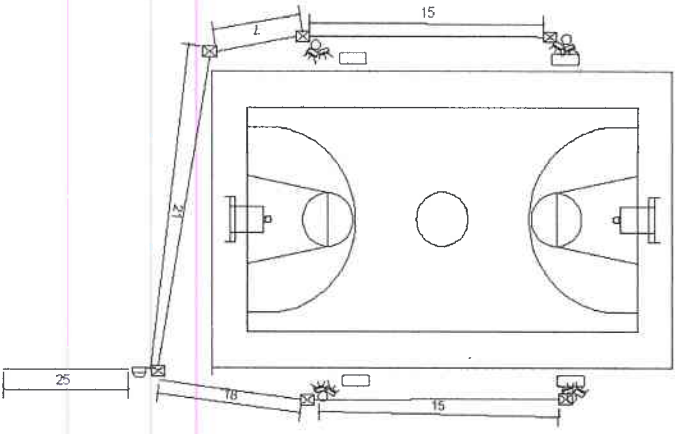

SIMBOLOGIA

- ANCLAJE CONCRETO
- REFINA CONCRETO
- REFINA DE ACERO
- REFINA DE ALAMBRE
- REFINA DE ALAMBRE
- REFINA DE ALAMBRE
- REFINA DE ALAMBRE



OBSERVACIONES GENERALES:

CONTRATISTA

MURRETA SOLUCIONES S.A. DE C.V.

SUPERVISOR DE OBRA


C. DUCE ALEJANDRA MARILES GUERRERO

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO N° CMCOP-15-2016
TERMINACION DE CANCHA MUNICIPAL JUNCIONAL
 UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO FRENTE A
 ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON LOCALIDAD
 JUJO ALVARO OBREGON, MUNICIPIO DE CABORCA
 UBICACION: CABORCA, SONORA

FECHA 18 de octubre de 2016
ESTIMACION N° 2
PERIODO DE ESTIMACION
DEL 15/08/2016 **AL** 17/10/2016

CLAVE	CONCEPTOS EJECUTADOS	AREA	ENTRE	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	PZAS.	CLARO	OBSERVACIONES	TOTAL	UNIDAD
9	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA						1			1.00	
TOTAL										1.00	LOTE

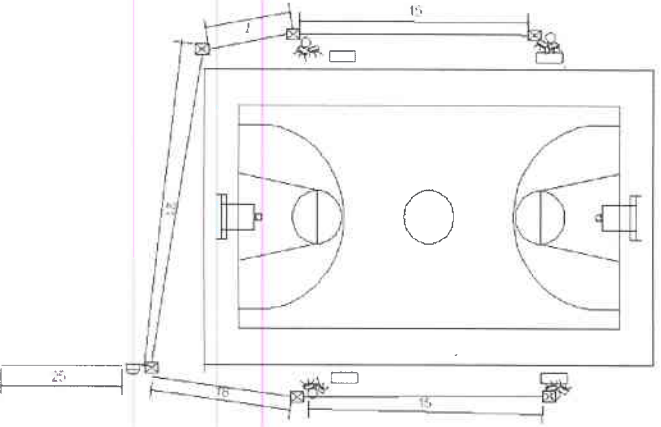

- SIMBOLOGIA**
- CUBIERTA
 - ▬ CANTONERAS
 - BARRAS
 - CIMENTACION
 - ▭ MUR DE CONTENIMIENTO
 - ▭ MUR DE ACERQUE
 - PISO DE CEMENTO
 - SERVIDOR DE SANEAMIENTO
 - ▭ BARRIDO DE CEMENTO



OBSERVACIONES GENERALES:

CONTRATISTA

MURRIETA SOLUCIONES S.A. DE C.V.



SUPERVISOR DE OBRA

C. DULCE ALEJANDRA MARILES GUERRERO

NOTA 6 23/07/16


Hay camaras con la colocacion de escorfid
completa incluye material, nivel de obra y fardo lo
necesario para su correcta ejecucion

NOTA 5 23/07/16
El dia de hoy camaras con la instalacion de celda
2H cal. se muy incluye: escorfid, poliduct-cortado
y fardo lo necesario para su correcta ejecucion



13/10/16

Hay comienzos con la construcción de banco de concreto a base de los de concreto incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.



13/10/16

Estadía se califica los trabajos con la limpieza final de los obra referidos en el contrato CMCOP-15-2016 en el cual se encuentran ejecutados los conceptos al 100% y se citare lo prescrito en el artículo de obra.

