

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA

RECIBO DE ESTIMACIONES

OBRA : TERMINACION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO FRENTE A PARQUE A UN COSTADO DE JARDIN DE NIÑOS LOCALIDAD EIDO JESUS GARCIA, MUNICIPIO CABORCA, SONORA

FECHA: 27/09/2016 UBICACION: CABORCA, SONORA POR OBRA EJECUTADA: DE : 15/08/2016 A: 20/09/2016

CONCEPTO: OBRA NORMAL ESTIMACION No. 1 RECIBIMOS DEL : GOBIERNO MUNICIPAL DE CABORCA, SONORA

LA CANTIDAD DE : \$ 130,368.35

NO. DE CONTRATO: CAB-CMCOP-14-2016 FECHA: 15/08/2016 IMPORTE S/IVA: \$ 227,832.50 ANTIPO S/IVA: \$ 68,349.75 INICIO: 15/08/2016 TERMINO: 17/10/2016 FISICO: 71% FINANCIERO: 80% TIPO DE INVERSION:

FIANZA DE ANTIPO No.: 0 FIANZA DE CUMPLIMIENTO No.: 0

ESTADO DE CUENTA DE ANTIPO (NO INCLUYE IVA)		LIQUIDACION		ESTADO DE CUENTA DE CONTRATO (NO INCLUYE I.V.A.)	
AMORTIZ. ACUM. ANTERIOR	\$ 0.00	IMPORTE ESTIMACION	\$ 161,446.86	ESTA ESTIMACION	\$ 161,446.86
AMORTIZ. EN ESTA ESTIMACION	\$ 48,434.06	AMORT. ANTIPO	\$ 48,434.06	ACUM. ANTERIOR	\$ 0.00
AMORTIZADO TOTAL	\$ 48,434.06	SUBTOTAL	\$ 113,012.80	ACUM. TOTAL	\$ 161,446.86
ANTICIPO OTORGADO	\$ 68,349.75	IVA	\$ 18,082.05	MONTO ASIGNADO AL CONTRATO	\$ 227,832.50
SALDO	\$ 19,915.69	TOTAL	\$ 131,094.85	SALDO	\$ 66,385.64
		DEDUCCIONES			
		I.C.I.C. .2%	\$ 322.89		
		INSP. Y VIGILANCIA .2%	\$ 322.89		
		UNISON 10% (S.I.V.)	\$ 32.29		
		CECOP 15% (S.I.V.)	\$ 48.43		
		SUMA DE DEDUCCIONES	\$ 726.50		
		BUENO POR	\$ 130,368.35		

FORMULARON

EL CONTRATISTA

SUPERVISOR

COORDINADOR CMCOP

APROBARON

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SAMUEL MURRIETA BELARANO

C. DULCE ALEJANDRA MARILES GUERRERO

C. LUIS ARTURO ORTEGA DUEÑAS

Q.B. KARINA GARCIA GUTIERREZ

TIPO DE OBRA DE LA ESTIMACION

FT16

OBRA : TERMINACION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO FRENTE A PARQUE A UN COSTADO DE JARDIN DE NIÑOS LOCALIDAD EJIDO JESUS GARCIA, MUNICIPIO	CONCEPTO: OBRA NORMAL ESTIMACION N° 1	RECIBIMOS DEL : LA CANTIDAD DE: \$130,368.35
FECHA : 27 de septiembre de 2016 UBICACION : CABORCA, SONORA	DEL: 15/08/2016 AL: 20/09/2016 POR OBRA EJECUTADA :	

No.	TIPO DE TRABAJO	IMPORTE	OBSERVACIONES
	SUBTOTAL HOJA 1	\$ 90,078.27	
	SUBTOTAL HOJA 2	\$ 44,144.47	
	SUBTOTAL HOJA 3	\$ 27,224.12	
	SUMA \$	161,446.86	

IMPORTE DE OBRA : 161,446.86 AMORTIZACION DE ANTICPO : 48,434.06 SUBTOTAL : 113,012.80 L.V.A. : 18,082.05	DEDUCCIONES I.C.I.C. 2 % 322.89 INSP. Y VIGILANCIA 2 % 322.89 UNISON 10 % (S.I.V.) 32.29 CECOP 15 % (S.I.V.) 48.43	ALCANCE LIQUIDO : 130,368.35
CONTRATISTA C. SAMUEL MURKETA BEJARANO	COORDINADOR CMCOP C. LUIS ARTURO ORTEGA DUEÑAS	APROBARON C. DULCE ALEJANDRA MARILES GUERRERO PRESIDENTA MUNICIPAL Q.B. KARINA GARCIA GUTIERREZ
FORMULARON SUPERVISOR		

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

FT17

OBRA : TERMINACION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO FRENTE A PARQUE A UN COSTADO DE JARDIN DE NIÑOS LOCALIDAD EIDO JESUS GARCIA, MUNICIPIO DE CABORCA SONORA		FECHA : 27/09/2016	POR OBRA EJECUTADA :	
CONCEPTO : OBRA NORMAL		UBICACION : CABORCA, SONORA	DE : 15/08/2016	A : 20/09/2016
Nº DE CONTRATO	FECHA	IMPORTE S/IVA	ANTICIPO S/IVA	ESTIMACION Nº
CAB-CMCOP-14-2016	15/08/2016	\$227,832.50	\$68,349.75	1
			IMPORTE DE ESTIMACION : \$	161,446.86
			FISICO 71%	FINANCIERO 80%
			TIPO DE INVERSION ESTATAL	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	P. UNITARIO	IMPORTE	CANTIDADES DE OBRA		
									ESTIMA	ESTIMA	
1	DADO DE CONCRETO DE SECCION 20X20 C. DE ALTURA VARIABLE, PARA COLOCACION DE ESTRUCTURA DE GRADAS CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DE 1/2" Y ESTRIBOS CON VARILLA DE 1/4" @ 20 CM, CIMBRA COMUN, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, COLADO, VIBRADO, CURADO Y DESCIMBRA, INCLUYE GANCHOS, ESCUADRAS, CRUCES Y DESPERDICIOS.	PZA	4.00	4.00	0.00	4.00	1,342.90	\$	5,371.60		
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO DE SECCION 20X20CM DE 3/8" DE ESPESOR PARA RECIBIR ESTRUCTURA DE PORTERIA Y GRADAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.00	4.00	0.00	4.00	1,201.26	\$	4,805.03		
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE PORTERIA A BASE DE TUBO ESTRUCTURAL DE 3" DE 3.0X 2.08 , ANCLAJE A LOSA.; DE ALTA RESISTENCIA O SIMILARES, AROS METALICOS REGLAMENTARIOS CON RED.	PZA	2.00	0.00	0.00	0.00	26,632.54	\$	-		
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO PARA ALUMBRADO DE 8 MTS. INCLUYE: OPSTE, BASE DE CONCRETO, CRUCETA, 2 LAMPARAS DE ADITIVO METALICO DE 1000w, CABLEADO EN EL INTERIOR DEL POSTE Y EN LAS LAMPARAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	4.00	4.00	0.00	4.00	19,975.41	\$	79,901.64		
								ESTA HOJA	\$	90,078.27	

CONTRATISTA

 MURRIETA SOLUCIONES S.A. DE C.V.

SUPERVISOR

 C. DULCE ALEJANDRA MARILES GUERRERO

PRESIDENTE MUNICIPAL
 Q.B. KARINA GARCIA GUTIERREZ

COORDINADOR CM COP CABORCA

 C. LUIS ARTURO ORTEGA DUEÑAS

POR EL MUNICIPIO DE CABORCA

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

FT17

OBRA : TERMINACION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO FRENTE A PARQUE A UN COSTADO DE JARDIN DE NIÑOS LOCALIDAD EIDO JESUS GARCIA, MUNICIPIO DE CABORCA SONORA CONCEPTO: OBRA NORMAL	FECHA : 27/09/2016 UBICACION : CABORCA, SONORA DE : 15/08/2016 A: 20/09/2016 CONCEPTO: OBRA NORMAL							
POR OBRA EJECUTADA :								
IMPORTE DE ESTIMACION : \$ 161,446.86								
Nº DE CONTRATO	FECHA	IMPORTE S/IVA	ESTIMACION Nº	INICIO	TERMINO	FISICO	FINANCIERO	TIPO DE INVERSION
CAB-CMCOP-14-2016	15/08/2016	\$227,832.50	1	15/08/2016	17/10/2016	71%	80%	ESTATAL

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PRESUPUESTO	CANTIDADES DE OBRA		ESTA ESTIMACION	P. UNITARIO	IMPORTE
				ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR			
5	INSTALACION DE CABLE 2+1 CAL 6 awg, INCLUYE: EXCAVACION, POLIDUCTO, CABLEADO, GUIA, CONEXIONES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	100.00	73.00	0.00	73.00	310.06	\$ 22,634.38
6	REGISTRO DE CONCRETO PARA ALUMBRADO CON TAPA DE 30x40, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	6.00	6.00	0.00	6.00	955.16	\$ 5,730.96
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA COMPLETA; INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	15,779.13	\$ 15,779.13
CONTRAFISTA								ESTA HOJA \$
SUPERVISOR								44,144.47

CONTRAFISTA MIRELETA SOLUCIONES S.A. DE C.V. PRESIDENTE MUNICIPAL	SUPERVISOR C. DULCE ALEJANDRA MARILES GUERRERO POR EL MUNICIPIO DE CABORCA COORDINADOR CMGOP CABORCA Q.B. KARINA GARCIA GUTIERREZ C. LUIS ARTURO ORTEGA DUEÑAS
--	--


CONTRATO ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

FT17

OBRA : TERMINACION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO FRENTE A PARQUE A UN COSTADO DE JARDIN DE NIÑOS LOCALIDAD ELIDO JESUS GARCIA, MUNICIPIO DE CABORCA SONORA				FECHA : 27/09/2016		POR OBRA EJECUTADA :	
CONCEPTO : OBRA NORMAL				UBICACION : CABORCA, SONORA		DE : 15/08/2016 A : 20/09/2016	
Nº DE CONTRATO	FECHA	IMPORTE S/IVA	ANTICIPO S/IVA	INICIO	TERMINO	FISICO	FINANCIERO
CAB-CMCOP-14-2016	15/08/2016	\$227,832.50	\$68,349.75	15/08/2016	17/10/2016	71%	80%
				ESTIMACION Nº 1		IMPORTE DE ESTIMACION : \$ 161,446.86	
				CANTIDADES DE OBRA		TIPO DE INVERSION ESTATAL	


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	P. UNITARIO	IMPORTE
8	FABRICACION DE BANCA DE 1.60 MTS DE LARGO A BASE ASIEN TO DE LOSA DE CONCRETO DE 0.40 MTS DE ANCHO Y 10 CM DE ESPESOR, DESPLANTADA SOBRE ZAPATA CORRIDA DE 0.40 MTS DE ANCHO Y 0.15 CM DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8, MUERETE DE BLOCK REFORZADO CON VAR VERTICALES DE 3/8 Y CELDAS COLADAS CON CONCRETO, MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	4.00	4.00	0.00	4.00	6,806.03	\$ 27,224.12
9	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA	LOTE	1.00	0.00	0.00	0.00	4,748.94	\$ -
			ESTA HOJA		\$		27,224.12	

CONTRATISTA



MURRIETA SOLUCIONES S.A. DE C.V.

SUPERVISOR




C. DULCE ALEJANDRA MARILES GUERRERO

PRESIDENTE MUNICIPAL

POR EL MUNICIPIO DE CABORCA

COORDINADOR CM/COP CABORCA

Q.B. KARINA GARCIA GUTIERREZ




C. LUIS ARTURO ORTEGA DUEÑAS

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO N° CAB-CMICOP-14-2016
 TERMINACION DE CANCHA MUNICIPAL JUNCIONAL
 UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO FRENTE A
 PARQUE A UN COSTADO DE JARDIN DE NIÑOS
 LOCALIDAD ELIDO JESUS GARCIA, MUNICIPIO DE
 UBICACION: CABORCA, SONORA

FECHA 27 de septiembre de 2016
 ESTIMACION N° 1
 PERIODO DE ESTIMACION
 DEL 15/08/2016 AL 20/09/2016

CLAVE	CONCEPTOS EJECUTADOS	EJE	ENTRE	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	PZAS.	CARAS	FORMULA	TOTAL	UNIDAD
1	DADO DE CONCRETO DE SECCION 20X20 C. DE ALTURA VARIABLE, PARA COLOCACION DE ESTRUCTURA DE GRADAS CONCRETO F'c=250 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DE 1/2" Y ESTRIBOS CON VARILLA DE 1/4" @ 20 CM, CIMBRA COMUN, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, COLADO, VIBRADO, CURADO Y DESCIMBRA, INCLUYE GANCOS, ESCUADRAS, CRUCES Y DESPERDICIOS.						4			4.00	
									TOTAL	4.00	PZA

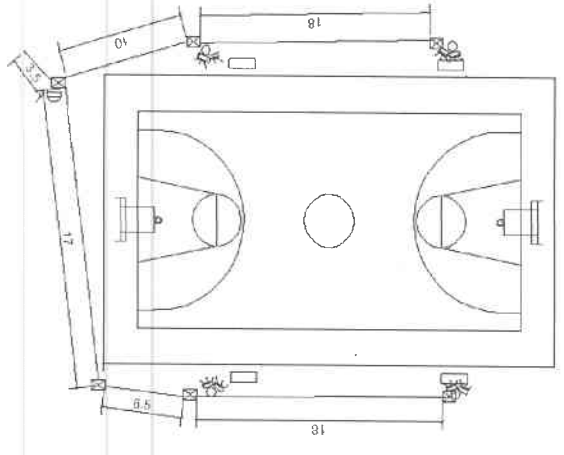

JESUS GARCIA

SIMBOLOGIA

- D: DIAMETRO DE VARILLA
- : ESTRIBOS EN SECCION
- : HABILITACION DE ACERO
- ⊗: GANCOS

OBSERVACIONES GENERALES:

CONTRATISTA
 MURRIETA SOLUCIONES S.A. DE C.V.


SUPERVISOR DE OBRA
 C. DULCE ALEJANDRA MARILLES GUERRERO

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO N° CAB-CMCO-14-2016
 TERMINACION DE CANCHA MU JUNCIONAL
 UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO FRENTE A
 PARQUE A UN COSTADO DE JARDIN DE NIÑOS
 LOCALIDAD: ELIDO JESUS GARCIA, MUNICIPIO DE
 UBICACION: CABORCA, SONORA

FECHA 27 de septiembre de 2016
 ESTIMACION N° 1
 PERIODO DE ESTIMACION
 DEL 15/08/2016 AL 20/09/2016

CLAVE	CONCEPTOS EJECUTADOS	EJE	ENTRE	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	PZAS.	CARAS	FORMULA	TOTAL	UNIDAD
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO DE SECCION 20X20CM DE 3/8" DE ESPESOR PARA RECIBIR ESTRUCTURA DE PORTERIA Y GRADAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.						4			4.00	
TOTAL										4.00	PZA

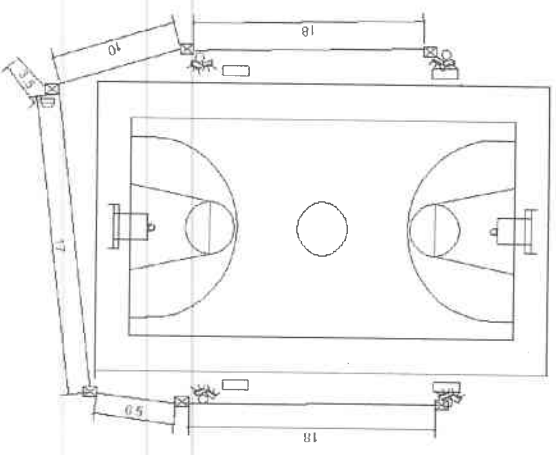

SIMBOLOGIA
 D: DIAMETRO
 H: ALTURA
 L: LONGITUD
 A: ANCHO
 P: PZAS.
 C: CARAS
 F: FORMULA
 T: TOTAL
 U: UNIDAD

OBSERVACIONES GENERALES:

CONTRATISTA
 MURRIETA SOLUCIONES S.A. DE C.V.




SUPERVISOR DE OBRA
 C. DULCE ALEJANDRA MARILES GUERRERO

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO N° CAB-CMCCOP-14-2016
 TERMINACION DE CANCHA MUNICIPAL FUNCIONAL
 UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO FRENTE A
 PARQUE A UN COSTADO DE JARDIN DE NIÑOS
 LOCALIDAD ELIDO JESUS GARCIA, MUNICIPIO DE
 UBICACION: CABORCA, SONORA

FECHA 27 de septiembre de 2016
 ESTIMACION N° 1
 PERIODO DE ESTIMACION
 DEL 15/08/2016 AL 20/09/2016

CLAVE	CONCEPTOS EJECUTADOS	AREA	ENTRE	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	PZAS.	CARAS	OBSERVACIONES	TOTAL	UNIDAD
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO PARA ALUMBRADO DE 8 MTS. INCLUYE: OPSTE, BASE DE CONCRETO, CRUCETA, 2 LAMPARAS DE ADITIVO METALICO DE 1000w, CABLEADO EN EL INTERIOR DEL POSTE Y EN LAS LAMPARAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO						4			4.00	
TOTAL										4.00	PZA

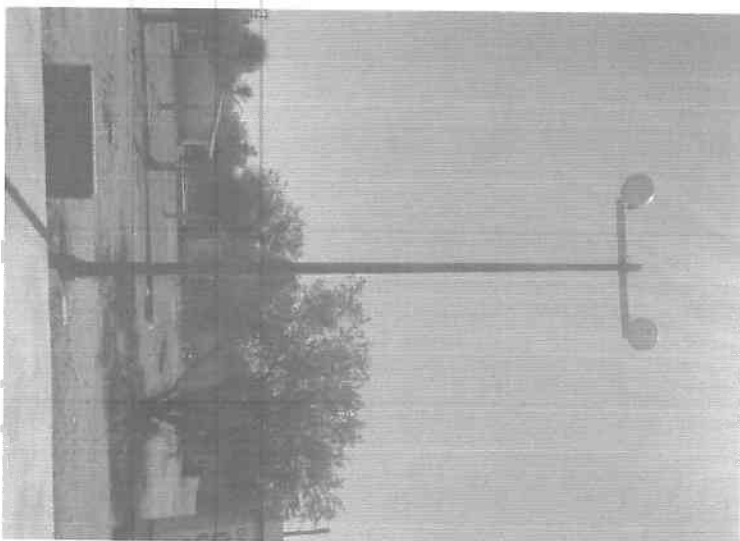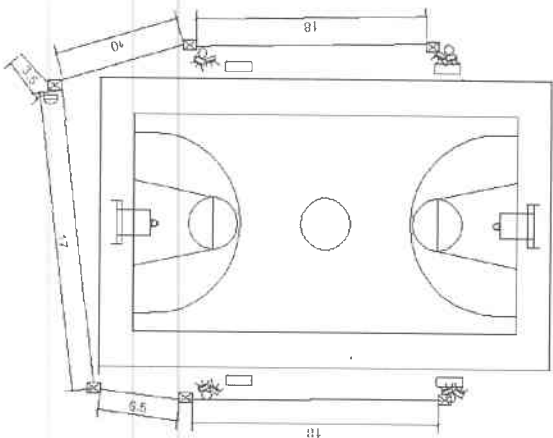

OBSERVACIONES GENERALES:

CONTRATISTA

MARILETA SOLUCIONES S.A. DE C.V.

SUPERVISOR DE OBRA


C. DULCE ALEJANDRA MARILES GUERRERO

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO N° CAB-CMCCP-14-2016
 TERMINACION DE CANCHA MUNICIPAL FUNCIONAL
 UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO FRENTE A
 PARQUE A UN COSTADO DE JARDIN DE NIÑOS
 LOCALIDAD ELIDO JESUS GARCIA, MUNICIPIO DE
 UBICACION: CABORCA, SONORA


FECHA 27 de septiembre de 2016
 ESTIMACION N° 1
 PERIODO DE ESTIMACION
 DEL 15/08/2016 AL 20/09/2016

CLAVE	CONCEPTOS EJECUTADOS	AREA	ENTRE	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	PZAS.	CARAS	FORMULA	TOTAL	UNIDAD
5	INSTALACION DE CABLE 2+1 CAL 6 awg, INCLUYE: EXCAVACION, POLIDUCTO, CABLEADO, GUIA, CONEXIONES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO			3.50						3.50	
				17.00						17.00	
				6.50						6.50	
				18.00						18.00	
				18.00						18.00	
				10.00						10.00	
TOTAL										73.00	ML

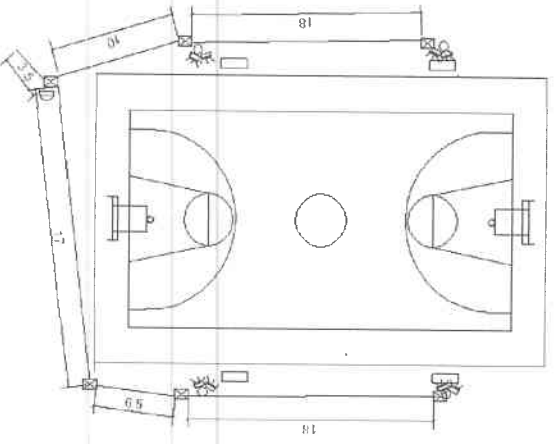

JESUS GARCIA

- SIMBOLOGIA**
- MANHOLE
 - CABLE
 - CONEXION
 - MANHOLE COVER
 - MANHOLE COVER

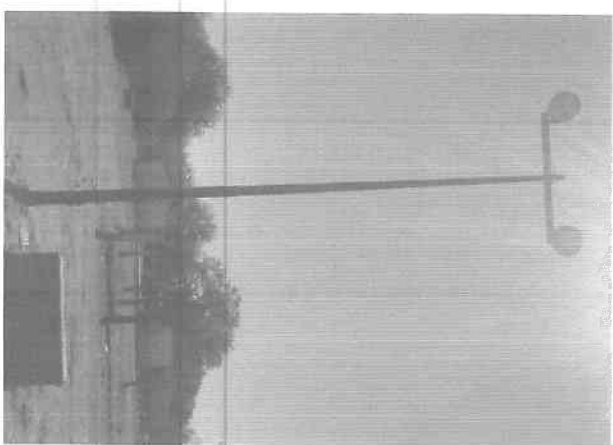

OBSERVACIONES GENERALES:

CONTRATISTA

MURRIETA SOLUCIONES S.A. DE C.V.

SUPERVISOR DE OBRA

C. DRYCE ALEANDRA MARILES GUERRERO

REGISTRO DE FIRMAS

NUMERO Y NOMBRE DE LA OBRA

Terminación de cancha multifuncional

Ubicada en domicilio conocido frente al

Barrio en el Estado Jesús María

Conchito


(AR-CUCAD-14-2006)

SUPERVISION

CONTRATISTAS

MORRIS SOLICITADOS S.A. de C.V.

Ing. Jesús Fr. Alvarez V.



Vº Bº COORDINACION

Vº Bº SUPERVISION

Vº Bº PATRON


NOM 15108116

El día de hoy iniciamos con la obra refuerzo de concreto (AB-MOP-19-2016) se inician los trabajos con la construcción de cimientos de concreto para la colocación de estructura de garajes y se le da todo lo necesario para su concreción.



NOM 25109116

El día de hoy comenzamos con el suministro y colocación de placas de acero para recibir garajes y relos. El resto de obra requiere y todo lo necesario para su concreción.




NOV 3 21/08/16

El día de hoy comenzamos con el suministro e instalación de estructura de góndolas a base de tubo estructural de 3" incluye todo lo necesario para su correcto operación.



NOV 4 05/09/16


Hay comienzos con la instalación de poste metálico para el tendedero de shirts incluye materiales seguros y método de corte.



Nº 1510716


Hay Comenzamos con la instalación de cable 211 sel.

o sea. incluye excavación, poliducto, colado y todo lo necesario o por su costo fuesen.




Nº 1510716

Hay Comenzamos con la colocación de armadura (cablets incluye material, mano de obra y todo lo necesario para su costo fuesen.



Boh 3 13/10/16

Hay comienzos con la construcción de boncos de cañete a base de losa de cañete incluye todo lo necesario para su montaje quedan



Boh 3 13/10/16

Estadía se concluyen los trabajos con la limpieza final de la obra referida en el contrato (PB-conceal-17-2016) en el cual se encuentran el detalle de los conceptos al 100% y se citare lo presento la fecha de obra -

