

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA

RECIBO DE ESTIMACIONES

OBRA : TERMINACION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO FRENTE A PARQUE A UN COSTADO DE JARDIN DE NIÑOS LOCALIDAD EJIDO JESUS GARCIA, MUNICIPIO OBRA NORMAL	FECHA: 18/10/2016	UBICACION: CABORCA, SONORA	POR OBRA EJECUTADA: DE : 21/09/2016 A: 17/10/2016
CONCEPTO: NO. DE CONTRATO	ESTIMACION No. 2	RECIBIMOS DEL : GOBIERNO MUNICIPAL DE CABORCA, SONORA LA CANTIDAD DE : \$ 53,606.40	TIPO DE INVERSION
CAB-CMCP-14-2016	FECHA 15/08/2016	IMPORTE S/IVA \$ 227,832.50	FINANCIERO 100%
	ANTICIPO S/IVA \$ 68,349.75	INICIO 15/08/2016	FINANCIERO 100%
		TERMINO 17/10/2016	
			FIANZA DE ANTICIPO No.: 0
			FIANZA DE CUMPLIMIENTO No.: 0

ESTADO DE CUENTA DE ANTICIPO (NO INCLUYE IVA)		LIQUIDACION		ESTADO DE CUENTA DE CONTRATO (NO INCLUYE I.V.A.)	
AMORTIZ. ACUM. ANTERIOR	\$ 48,434.06	IMPORTE ESTIMACION	\$ 66,385.64	ESTA ESTIMACION	\$ 66,385.64
AMORTIZ. EN ESTA ESTIMACION	\$ 19,915.69	AMORT. ANTICIPO	\$ 19,915.69	ACUM. ANTERIOR	\$ 161,446.86
AMORTIZADO TOTAL	\$ 68,349.75	SUBTOTAL	\$ 46,469.95	ACUM. TOTAL	\$ 227,832.50
		IVA	\$ 7,435.19		
		TOTAL	\$ 53,905.14		
		DEDUCCIONES			
		I.C.I.C. 2%	\$ 132.77	MONTO ASIGNADO AL CONTRATO	\$ 227,832.50
		INSP. Y VIGILANCIA 2%	\$ 132.77		
		UNISON 10% (S.I.V.)	\$ 13.28		
		CECOP 15% (S.I.V.)	\$ 19.92		
SALDO	\$ 0.00	SUMA DE DEDUCCIONES	\$ 298.74	SALDO	\$ 0.00

BUENO POR

53,606.40

FORMULARON

EL CONTRATISTA




C. SAMUEL MURRIETA BELARANO

SUPERVISOR



C. DULCE ALEJANDRA MARILES GUERRERO

COORDINADOR CMCP



C. LUIS ARTURO ORTEGA DUEÑAS

APROBARON

PRESIDENTA MUNICIPAL



Q.B. KARINA GARCIA GUTIERREZ


TIPO DE OBRA DE LA ESTIMACION

FT16

OBRA : TERMINACION DE CANCHA MULTIFUNCCIONAL UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO FRENTE A PARQUE A UN COSTADO DE JARDIN DE NIOS LOCALIDAD EIDO JESUS GARCIA, MUNICIPIO		CONCEPTO: OBRA NORMAL	2	ESTIMACION N°	RECIBIMOS DEL :	LA CANTIDAD DE: \$53,606.40
FECHA : 18 de octubre de 2016		UBICACION : CABORCA, SONORA				
DEL: 21/09/2016		AL: 17/10/2016				
POR OBRA EJECUTADA :						

No.	TIPO DE TRABAJO	IMPORTE	OBSERVACIONES
	SUBTOTAL HOJA 1 \$	63,441.71	
	SUBTOTAL HOJA 2 \$	-	
	SUBTOTAL HOJA 3 \$	2,943.93	
	SUMA \$	66,385.64	

IMPORTE DE OBRA :	66,385.64	AMORTIZACION DE ANTICIPO :	19,915.69	SUBTOTAL :	46,469.95
DEDUCCIONES		L.V.A.	7,435.19		
I.C.I.C. .2 %	132.77				
INSP. Y VIGILANCIA .2 %	132.77				
UNISON 10 % (S.I.V.)	13.28				
CECOP 15 % (S.I.V.)	19.92				
ALCANCE LIQUIDO :	53,606.40				

CONTRATISTA C. SAMUEL MURRIETA BEJARANO 	COORDINADOR CM COP C. LUIS ARTURO ORTEGA DUEÑAS 
FORMULARON	APROBARON
SUPERVISOR C. DULCE ALEJANDRA MARILES GUERRERO 	PRESIDENTA MUNICIPAL Q.B. KARINA GARCIA GUTIERREZ

CONTRATACIÓN ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

FT17

OBRA : TERMINACION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO FRENTE A PARQUE A UN COSTADO DE JARDIN DE NIÑOS LOCALIDAD EIDO JESUS GARCIA, MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA		FECHA : 18/10/2016		POR OBRA EJECUTADA :	
CONCEPTO : OBRA NORMAL		UBICACION : CABORCA, SONORA		DE : 21/09/2016 A : 17/10/2016	
Nº DE CONTRATO	FECHA	IMPORTE S/IVA	ANTICIPO S/IVA	INICIO	TERMINO
CAB-CMCOP-14-2016	15/08/2016	\$227,832.50	\$68,349.75	15/08/2016	17/10/2016
ESTIMACION Nº 2			IMPORTE DE ESTIMACION : \$ 66,385.64		
CANTIDADES DE OBRA			FISICO 100%	FINANCIERO 100%	TIPO DE INVERSION ESTATAL

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	DADO DE CONCRETO DE SECCION 20X20 C. DE ALTURA VARIABLE, PARA COLOCACION DE ESTRUCTURA DE GRADAS CONCRETO F.C=250 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DE 1/2" Y ESTRIBOS CON VARILLA DE 1/4" @ 20 CM, CIMBRA COMUN, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, COLADO, VIBRADO, CURADO Y DESCIMBRA, INCLUYE GANCHOS, ESCUADRAS, CRUCES Y DESPERDICIOS.	PZA	4.00	4.00	0.00	4.00	1,342.90	\$ 5,371.60
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO DE SECCION 20X20CM DE 3/8" DE ESPESOR PARA RECIBIR ESTRUCTURA DE PORTERIA Y GRADAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.00	4.00	0.00	4.00	1,201.26	\$ 4,805.03
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE PORTERIA A BASE DE TUBO ESTRUCTURAL DE 3" DE 3.0X 2.08 , ANCLAJE A LOSA.; DE ALTA RESISTENCIA O SIMILARES, AROS METALICOS REGLAMENTARIOS CON RED.	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	26,632.54	\$ 53,265.08
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO PARA ALUMBRADO DE 8 MTS, INCLUYE: OPSTÉ, BASE DE CONCRETO, CRUCETA, 2 LAMPARAS DE ADITIVO METALICO DE 1000w, CABLEADO EN EL INTERIOR DEL POSTE Y EN LAS LAMPARAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	4.00	0.00	0.00	0.00	19,975.41	\$ -
ESTA HOJA							\$	63,441.71

CONTRATISTA

 MURRIETA SOLUCIONES S.A. DE C.V.

SUPERVISOR

 C. DULCE ALEJANDRA MARILES GUERRERO

PRESIDENTE MUNICIPAL
 Q.B. KARINA GARCIA GUTIERREZ

COORDINADOR CMCOP CABORCA

 C. LUIS ARTURO ORTEGA DUEÑAS

POR EL MUNICIPIO DE CABORCA

CONTRATO ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES


FT17

OBRA : TERMINACION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO FRENTE A PARQUE A UN COSTADO DE JARDIN DE NIÑOS LOCALIDAD EIDO JESUS GARCIA, MUNICIPIO DE CABORCA SONORA				FECHA : 18/10/2016		POR OBRA EJECUTADA :	
CONCEPTO : OBRA NORMAL				UBICACION : CABORCA, SONORA		DE : 21/09/2016 A : 17/10/2016	
Nº DE CONTRATO	FECHA	IMPORTE S/IVA	ESTIMACION Nº	INICIO	TERMINO	FISICO	FINANCIERO
CAB-CMCOPI-14-2016	15/08/2016	\$227,832.50	2	15/08/2016	17/10/2016	100%	100%
				IMPORTE DE ESTIMACION : \$			
				TIPO DE INVERSION		ESTATAL	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PRESUPUESTO	CANTIDADES DE OBRA		ESTA ESTIMACION	P. UNITARIO	IMPORTE	
				ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR				
8	FABRICACION DE BANCA DE 1.60 MTS DE LARGO A BASE ASIEN TO DE LOSA DE CONCRETO DE 0.40 MTS DE ANCHO Y 10 CM DE ESPESOR, DESPLANTADA SOBRE ZAPATA CORRIDA DE 0.40 MTS DE ANCHO Y 0.15 CM DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8, MUERETE DE BLOCK REFORZADO CON VAR VERTICALES DE 3/8 Y CELIDAS COLADAS CON CONCRETO, MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	4.00	0.00	0.00	0.00	6,806.03	\$	
9	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA	LOTE	1.00	1.00	0.00	1.00	4,748.94	\$	
10	INSTALACION DE CABLE 2+1 CAL 6 awg, INCLUYE: EXCAVACION, POLIDUCTO, CABLEADO, GUIA, CONEXIONES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	100.00	-5.82	0.00	-5.821486	310.06	-\$	
								ESTA HOJA	\$
									2,943.93

CONTRATISTA

MURRIETA SOLUCIONES S.A. DE C.V.

SUPERVISOR

C. DULCE ALEJANDRA MARILES GUERRERO

POR EL MUNICIPIO DE CABORCA

PRESIDENTE MUNICIPAL
Q.B. KARINA GARCIA GUTIERREZ

COORDINADOR CMCOPI CABORCA




C. LUIS ABUJURO ORTEGA DUEÑAS

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO N° CAB-CMCO-P-14-2016
 TERMINACION DE CANCHA MUNICIPAL UNCIONAL
 UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO FRENTE A
 PARQUE A UN COSTADO DE JARDIN DE NIÑOS
 LOCALIDAD EJIDO JESUS GARCIA, MUNICIPIO DE
 UBICACION: CABORCA, SONORA

FECHA 18 de octubre de 2016
 ESTIMACION N° 2
 PERIODO DE ESTIMACION
 DEL 15/08/2016 AL 17/10/2016

CLAVE	CONCEPTOS EJECUTADOS	EJE	ENTRE	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	PZAS.	CARAS	FORMULA	TOTAL	UNIDAD
1	DADO DE CONCRETO DE SECCION 20X20 C. DE ALTURA VARIABLE, PARA COLOCACION DE ESTRUCTURA DE GRADAS CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DE 1/2" Y ESTRIBOS CON VARILLA DE 1/4" @ 20 CM, CIMBRA COMUN, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, COLADO, VIBRADO, CURADO Y DESCIMBRA, INCLUYE GANCOS, ESCUADRAS, CRUCES Y DESPERDICIOS.						4			4.00	
TOTAL										4.00	PZA

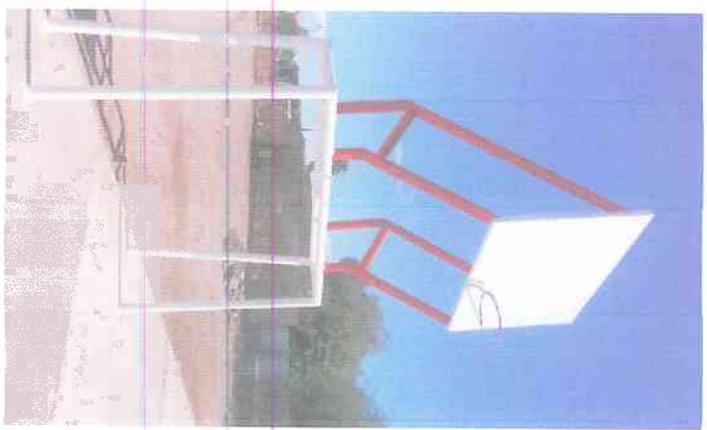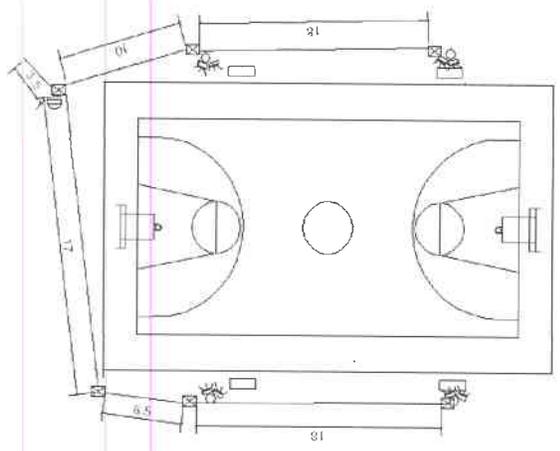

OBSERVACIONES GENERALES:

CONTRATISTA
 MURRIETA SOLUCIONES S.A. DE C.V.



SUPERVISOR DE OBRA
 C. DULCE ALEJANDRA MARILES GUERRERO

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO N° CAB-CMCOPI-14-2016
TERMINACION DE CANCHA M² FUNCIONAL
 UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO FRENTE A
 PARQUE A UN COSTADO DE JARDIN DE NIÑOS
 LOCALIDAD ELIDO JESUS GARCIA, MUNICIPIO DE
 UBICACION: CABORCA, SONORA

FECHA 18 de octubre de 2016
ESTIMACION N° 2
PERIODO DE ESTIMACION
 DEL 15/08/2016 AL 17/10/2016

CLAVE	CONCEPTOS EJECUTADOS	EJE		LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	PZAS.	CARAS	OBSERVACIONES	TOTAL	UNIDAD
		ENTRE									
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE PORTERIA A BASE DE TUBO ESTRUCTURAL DE 3" DE 3.0 X 2.08, ANCLAJE A LOSA.; DE ALTA RESISTENCIA O SIMILARES, AROS METALICOS REGLAMENTARIOS CON RED.						2			2.00	
										TOTAL	2.00
											PZA

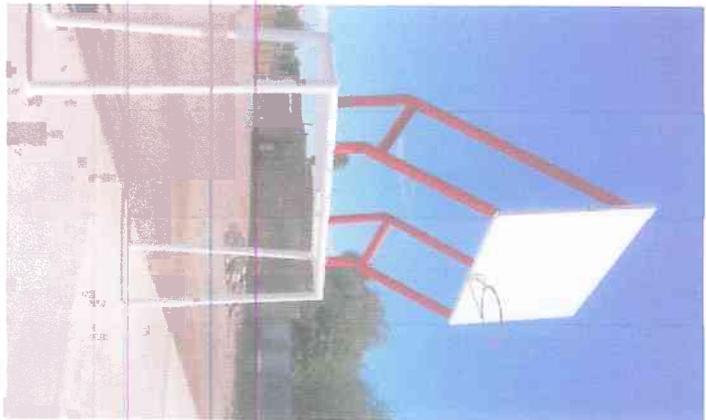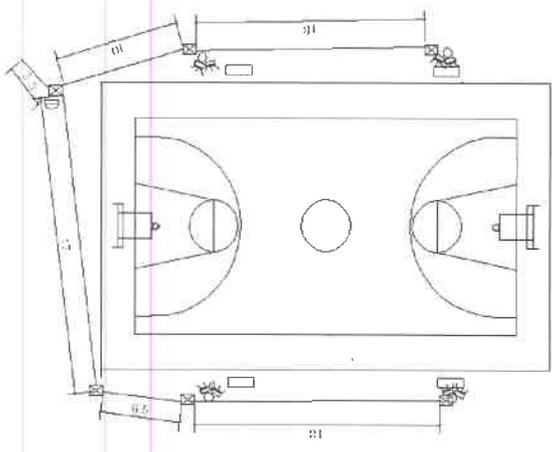

OBSERVACIONES GENERALES:

CONTRATISTA

MURRIETA SOLUCIONES S.A. DE C.V.

SUPERVISOR DE OBRA


C. DULCE ALEJANDRA MARILES GUERRERO

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO N° CAB-CMCOPI-14-2016
 TERMINACION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL
 UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO FRENTE A
 PARQUE A UN COSTADO DE JARDIN DE NIÑOS
 LOCALIDAD EJIDO JESUS GARCIA, MUNICIPIO DE
 UBICACION: CABORCA, SONORA

FECHA 18 de octubre de 2016
 ESTIMACION N° 2
 PERIODO DE ESTIMACION
 DEL 15/08/2016 AL 17/10/2016

CLAVE	CONCEPTOS EJECUTADOS	AREA	ENTRE	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	PZAS.	CLARO	OBSERVACIONES	TOTAL	UNIDAD
9	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA						1			1.00	
TOTAL										1.00	LOTE

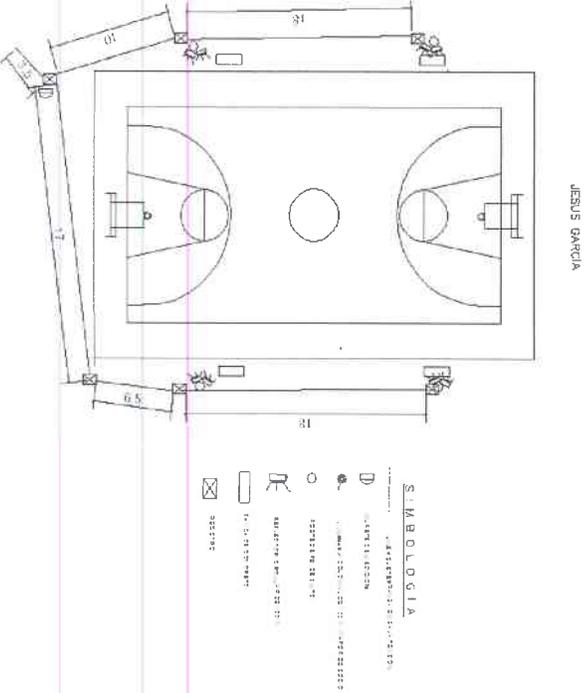

OBSERVACIONES GENERALES:

CONTRATISTA

MURRIETA SOLUCIONES S.A. DE C.V.

SUPERVISOR DE OBRA


C. DVICE ALEANDRA MARILES GUERRERO

GENERADOR DE OBRA



CONTRATO N° CAB-CMCOP-14-2016
 TERMINACION DE CANCHA MIL UNCIONAL
 UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO FRENTE A
 PARQUE A UN COSTADO DE JARDIN DE NIÑOS
 LOCALIDAD EIJDO JESUS GARCIA, MUNICIPIO DE
 UBICACION: CABORCA, SONORA

FECHA 18 de octubre de 2016
 ESTIMACION N° 2
 PERIODO DE ESTIMACION
 DEL 15/08/2016 AL 17/10/2016

CLAVE	CONCEPTOS EJECUTADOS	AREA	ENTRE	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	PZAS.	CLAROS	OBSERVACIONES	TOTAL	UNIDAD
10	INSTALACION DE CABLE 2+1 CAL 6 awg, INCLUYE: EXCAVACION, POLIDUCTO, CABLEADO, GUIA, CONEXIONES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO			-5.821486						-5.821486	
TOTAL										-5.821486	ML

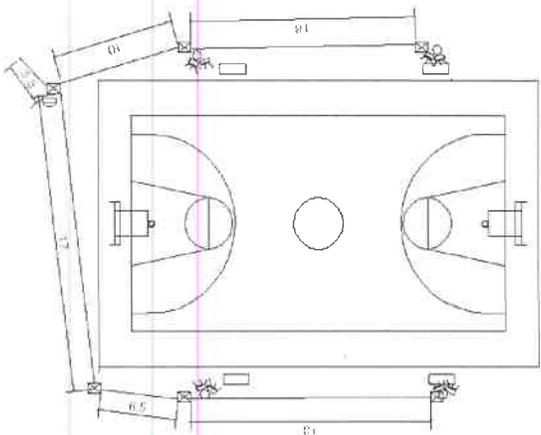

JESUS GARCIA

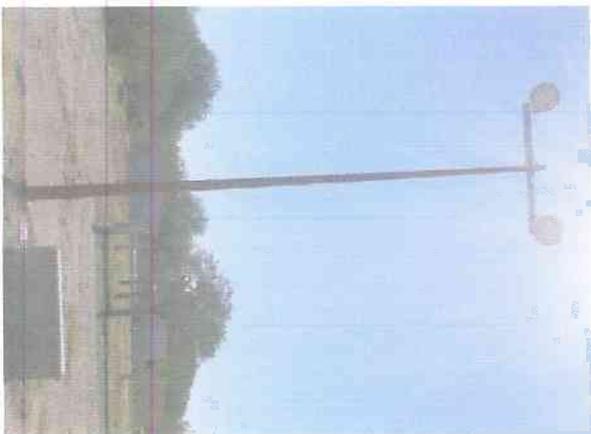

OBSERVACIONES GENERALES:

CONTRATISTA

MURRIETA SOLUCIONES S.A. DE C.V.

SUPERVISOR DE OBRA

ING. CARLOS LIZARRAGA LOZOVA
