

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA

RECIBO DE ESTIMACIONES

OBRA :
 TERMINACION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL UBICADA EN BOULEVARD PRINCIPALA 100 M
 DE LA ESCUELA PRIMARIA LOCALIDAD ELIDO LA ALMITA, MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

FECHA: 27/09/2016
 UBICACION: CABORCA, SONORA

POR OBRA EJECUTADA: 15/08/2016 A: 20/09/2016

CONCEPTO:	ESTIMACION No.	RECIBIMOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE CABORCA, SONORA	LA CANTIDAD DE:	FINANCIERO	TIPO DE INVERSION		
OBRA NORMAL	1		\$ 134,374.31				
NO. DE CONTRATO	FECHA	IMPORTE S/IVA	ANTICIPO S/IVA	INICIO	TERMINO	FISICO	FINANCIERO
CAB-CMCP-17-2016	15/08/2016	\$ 227,832.50	\$ 68,349.75	15/08/2016	17/10/2016	73%	81%

FIANZA DE ANTICIPO No.: 0
 FIANZA DE CUMPLIMIENTO No.: 0

ESTADO DE CUENTA DE ANTICIPO (NO INCLUYE IVA)		LIQUIDACION		ESTADO DE CUENTA DE CONTRATO (NO INCLUYE I.V.A.)	
AMORTIZ. ACUM.	\$ 0.00	IMPORTE ESTIMACION	\$ 166,407.82	ESTA ESTIMACION	\$ 166,407.82
ANTERIOR		AMORT. ANTICIPO	\$ 49,922.35	ACUM. ANTERIOR	\$ 0.00
AMORTIZ. EN ESTA ESTIMACION	\$ 49,922.35	SUBTOTAL	\$ 116,485.47	ACUM. TOTAL	\$ 166,407.82
AMORTIZADO TOTAL	\$ 49,922.35	IVA	\$ 18,637.68		
		TOTAL	\$ 135,123.15		
		DEDUCCIONES			
		I.C.I.C. .2 %	\$ 332.82		
		INSP. Y VIGILANCIA .2 %	\$ 332.82		
		UNISON 10 % (S.I.V.)	\$ 33.28		
		CECOP 15 % (S.I.V.)	\$ 49.92		
		SUMA DE DEDUCCIONES	\$ 748.84		
SALDO	\$ 18,427.40			SALDO	\$ 61,424.68

BUENO POR

134,374.31

FORMULARON

EL CONTRATISTA

SUPERVISOR

COORDINADOR CMCP

APROBARON

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SAMUEL MURRIETA BEJARANO

C. DUJCE ALEJANDRA MARILES GUERRERO

C. LUIS ARBURO ORTEGA DUENAS

Q.B. KARINA GARCIA GUTIERREZ

CONTRATO ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

FT17

OBRA : TERMINACION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL UBICADA EN BOULEVARD PRINCIPALA 100 M DE LA ESCUELA PRIMARIA LOCALIDAD EIDO LA ALMITA, MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

CONCEPTO: OBRA NORMAL

Nº DE CONTRATO	FECHA	IMPORTE S/IVA	ANTICIPO S/IVA	INICIO	TERMINO	IMPORTE DE ESTIMACION :	TIPO DE INVERSION
CAB-CMCOPI-17-2016	15/08/2016	\$227,832.50	\$68,349.75	15/08/2016	17/10/2016	\$ 166,407.82	ESTATAL

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PRESUPUESTO	CANTIDADES DE OBRA		ESTA ESTIMACION	P. UNITARIO	IMPORTE	
				ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR				
1	DADO DE CONCRETO DE SECCION 20X20 C. DE ALTURA VARIABLE, PARA COLOCACION DE ESTRUCTURA DE GRADAS CONCRETO F'c=250 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DE 1/2" Y ESTRIBOS CON VARILLA DE 1/4" @ 20 CM, CIMBRA COMUN, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, COLADO, VIBRADO, CURADO Y DESCIMBRA, INCLUYE GANCHOS, ESCUADRAS, CRUCES Y DESPERDICIOS.	PZA	4.00	4.00	0.00	4.00	1,342.90	\$ 5,371.60	
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO DE SECCION 20X20CM DE 3/8" DE ESPESOR PARA RECIBIR ESTRUCTURA DE PORTERIA Y GRADAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELECUCION.	PZA	4.00	4.00	0.00	4.00	1,201.26	\$ 4,805.03	
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE PORTERIA A BASE DE TUBO ESTRUCTURAL DE 3" DE 3.0 X 2.08 , ANCLAJE A LOSA.; DE ALTA RESISTENCIA O SIMILARES, AROS METALICOS REGLAMENTARIOS CON RED.	PZA	2.00	0.00	0.00	0.00	26,632.54	\$ -	
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO PARA ALUMBRADO DE 8 MTS, INCLUYE: OPSTE, BASE DE CONCRETO, CRUCETA, 2 LAMPARAS DE ADITIVO METALICO DE 1000w, CABLEADO EN EL INTERIOR DEL POSTE Y EN LAS LAMPARAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	4.00	4.00	0.00	4.00	19,975.41	\$ 79,901.64	
SUPERVISOR								ESTA HOJA	\$ 90,078.27

 **CONTRALISTA**
 **SUPERVISOR**
MURREITA SOLUCIONES S.A. DE C.V. **C. DULCE ALEJANDRA MARILES GUERRERO**

POR EL MUNICIPIO DE CABORCA



PRESIDENTE MUNICIPAL  Q.B. KARINA GARCIA GUTIERREZ	COORDINADOR CMCOPI CABORCA  C. LUIS ARTURO ORTEGA DUEÑAS
---	---

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

FT17

OBRA : TERMINACION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL UBICADA EN BOULEVARD PRINCIPALA 100 M DE LA ESCUELA PRIMARIA LOCALIDAD EJIDO LA ALMITA, MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.	FECHA : 27/09/2016	POR OBRA EJECUTADA :
CONCEPTO : OBRA NORMAL	UBICACION : CABORCA, SONORA	DE : 15/08/2016 A : 20/09/2016
Nº DE CONTRATO	FECHA	IMPORTE S/IVA
CAB-CMCOPI-17-2016	15/08/2016	\$227,832.50
ESTIMACION Nº	ANTICIPO S/IVA	IMPORTE DE ESTIMACION :
1	\$68,349.75	\$
INICIO	TERMINO	FISICO
15/08/2016	17/10/2016	73%
SEGUN PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR
100.00	89.00	0.00
ESTIMACION Nº	ESTIMACION	ESTIMACION
1	81%	81%
TIPO DE INVERSION	CANTIDADES DE OBRA	
ESTATAL		
	ESTIMACION	IMPORTE
	166,407.82	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	P. UNITARIO	IMPORTE
5	INSTALACION DE CABLE 2+1 CAL 6 awg, INCLUYE: EXCAVACION, POLIDUCTO, CABLEADO, GUIA, CONEXIONES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	100.00	89.00	0.00	89.00	310.06	\$ 27,595.34
6	REGISTRO DE CONCRETO PARA ALUMBRADO CON TABA DE 30x40, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	6.00	6.00	0.00	6.00	955.16	\$ 5,730.96
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA COMPLETA; INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	15,779.13	\$ 15,779.13
ESTA HOJA								\$ 49,105.43

CONTRATISTA  MURRIETA SOLUCIONES S.A. DE C.V.	SUPERVISOR  C. DULCE ALEJANDRA MARILES GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL Q.B. KARINA GARCIA GUTIERREZ	COORDINADOR CMCOPI CABORCA  C. LUIS ARTURO ORTEGA DUEÑAS

POR EL MUNICIPIO DE CABORCA

CONTRATO ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

FT17

OBRA : TERMINACION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL UBICADA EN BOULEVARD PRINCIPALA 100 M DE LA ESCUELA PRIMARIA LOCALIDAD EIDO LA ALMITA, MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

FECHA : 27/09/2016
UBICACION : CABORCA, SONORA

POR OBRA EJECUTADA : DE : 15/08/2016 A: 20/09/2016

CONCEPTO: OBRA NORMAL

ESTIMACION N° 1

IMPORTE DE ESTIMACION : \$ 166,407.82

N° DE CONTRATO	FECHA	IMPORTE S/IVA	ANTICIPO S/IVA	INICIO	TERMINO	FISICO	FINANCIERO	TIPO DE INVERSION
CAB-CMCOP-17-2016	15/08/2016	\$227,832.50	\$68,349.75	15/08/2016	17/10/2016	73%	81%	ESTATAL

CANTIDADES DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PRESUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	P. UNITARIO	IMPORTE
8	FABRICACION DE BANCA DE 1.60 MTS DE LARGO A BASE ASIEN TO DE LOSA DE CONCRETO DE 0.40 MTS DE ANCHO Y 10 CM DE ESPESOR, DESPLANTADA SOBRE ZAPATA CORRIDA DE 0.40 MTS DE ANCHO Y 0.15 CM DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8, MUERETE DE BLOCK REFORZADO CON VAR VERTICALES DE 3/8 Y CELDAS COLADAS CON CONCRETO, MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	4.00	4.00	0.00	4.00	6,806.03	\$ 27,224.12
9	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA	LOTE	1.00	0.00	0.00	0.00	4,748.94	\$ -
ESTA HOJA \$ 27,224.12								

CONTRATISTA

MURRIETA SOLUCIONES S.A. DE C.V.

SUPERVISOR

C. DULCE ALEJANDRA MARILES GUERRERO

PRESIDENTE MUNICIPAL

POR EL MUNICIPIO DE CABORCA

COORDINADOR CMCOP CABORCA


Q.B. KARINA GARCIA GUTIERREZ

C. LUIS ARTURO ORTEGA DUEÑAS

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO N° CAB-CM/COP-17-2016	FECHA 27 de septiembre de 2016
TERMINACION DE CANCHA M... FUNCIONAL	ESTIMACION N° 1
UBICADA EN BOULEVARD PRINCIPALA 100 M DE LA ESCUELA PRIMARIA LOCALIDAD EIJDO LA ALMITA, MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA	PERIODO DE ESTIMACION
UBICACION: CABORCA, SONORA	DEL 15/08/2016 AL 20/09/2016

CLAVE	CONCEPTOS EJECUTADOS	EJE	ENTRE	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	PZAS.	CARAS	FORMULA	TOTAL	UNIDAD
1	DADO DE CONCRETO DE SECCION 20X20 C. DE ALTURA VARIABLE, PARA COLOCACION DE ESTRUCTURA DE GRADAS CONCRETO F'c=250 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DE 1/2" Y ESTRIBOS CON VARILLA DE 1/4" @ 20 CM, CIMBRA COMUN, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, COLADO, VIBRADO, CURADO Y DESCIMBRA, INCLUYE GANCHOS, ESCUADRAS, CRUCES Y DESPERDICIOS.						4			4.00	
	TOTAL									4.00	PZA

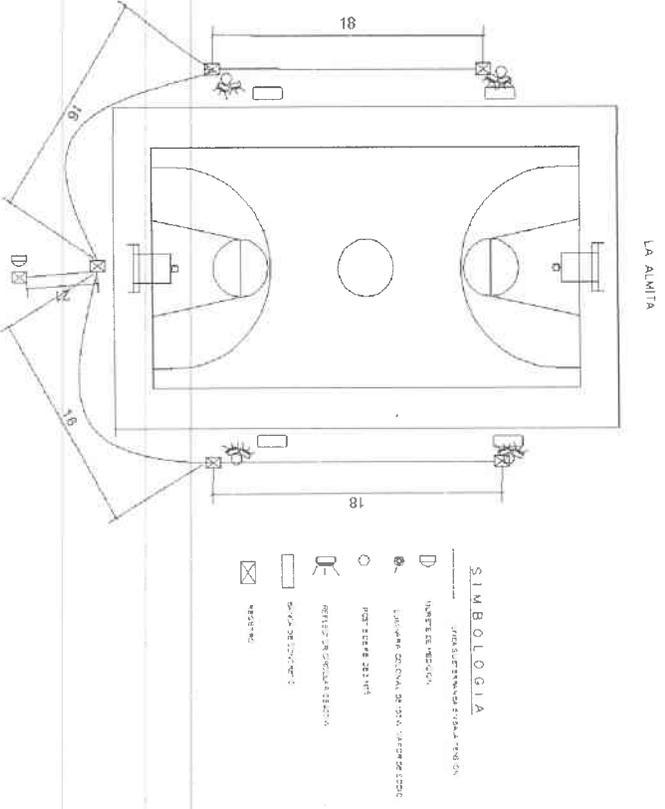

CONTRATISTA: MURRIETASOLUCIONES S.A. DE C.V.

SUPERVISOR DE OBRA: C. DULCE ALEJANDRA MARILES GUERRERO


OBSERVACIONES GENERALES:

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO N° CAB-CMCOPI-17-2016
TERMINACION DE CANCHA M. FUNCIONAL
 UBICADA EN BOULEVARD PRINCIPALA 100 M DE LA
 ESCUELA PRIMARIA LOCALIDAD EJIDO LA ALMITA,
 MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
UBICACION: CABORCA, SONORA

FECHA 27 de septiembre de 2016
ESTIMACION N° 1
PERIODO DE ESTIMACION
 DEL 15/08/2016 AL 20/09/2016

CLAVE	CONCEPTOS EJECUTADOS	EJE	ENTRE	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	PZAS.	CARAS	FORMULA	TOTAL	UNIDAD
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO DE SECCION 20X20CM DE 3/8" DE ESPESOR PARA RECIBIR ESTRUCTURA DE PORTERIA Y GRADAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.						4			4.00	
									TOTAL	4.00	PZA

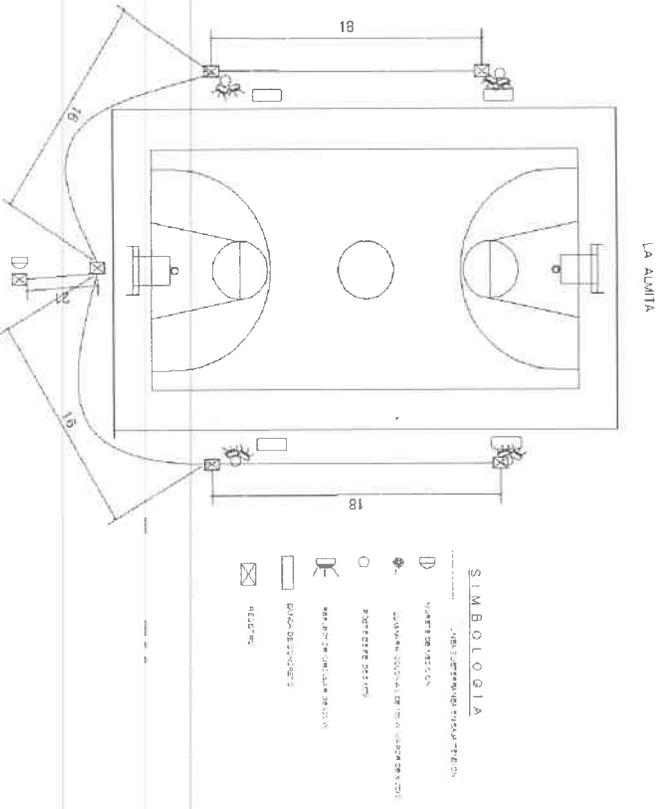

OBSERVACIONES GENERALES:

CONTRATISTA
 MURRIETA SOLUCIONES S.A. DE C.V.



SUPERVISOR DE OBRA
 C. DULCE ALEJANDRA MARILES GUERRERO

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO N° CAB-CMCP-17-2016
 TERMINACION DE CANCHA M... FUNCIONAL
 UBICADA EN BOULEVARD PRINCIPAL A LA 100 M DE LA
 ESCUELA PRIMARIA LOCALIDAD EIJO LA ALMITA,
 MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
 UBICACION: CABORCA, SONORA

FECHA 27 de septiembre de 2016
 ESTIMACION N° 1
 PERIODO DE ESTIMACION
 DEL 15/08/2016 AL 20/09/2016

CLAVE	CONCEPTOS EJECUTADOS	AREA	ENTRE	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	PZAS.	CARAS	OBSERVACIONES	TOTAL	UNIDAD
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO PARA ALUMBRADO DE 8 MTS, INCLUYE: OPSTE, BASE DE CONCRETO, CRUCETA, 2 LAMPARAS DE ADITIVO METALICO DE 1000W, CABLEADO EN EL INTERIOR DEL POSTE Y EN LAS LAMPARAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO						4			4.00	
TOTAL										4.00	PZA

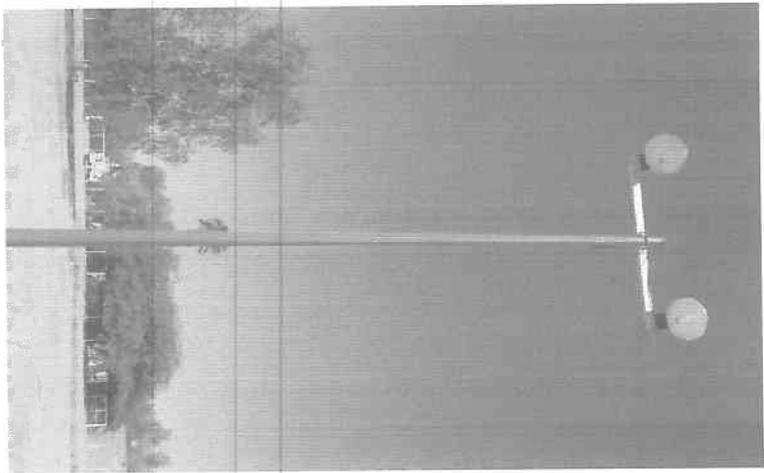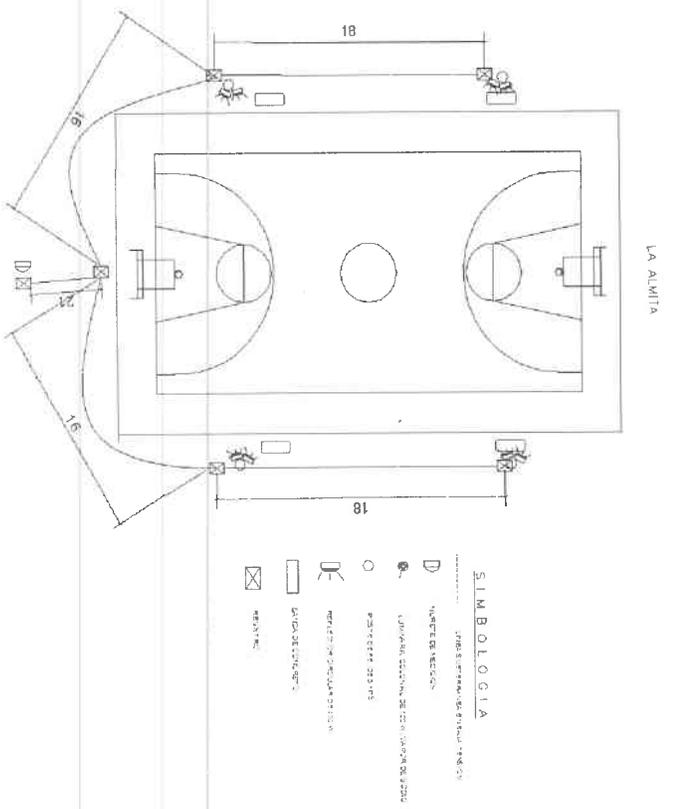

OBSERVACIONES GENERALES:

CONTRATISTA
 MURRIETA SOLUCIONES S.A. DE C.V.


SUPERVISOR DE OBRA
 G-DULCE ALEJANDRA MARILES GUERRERO

GENERADOR DE OBRA


CONTRATO N° CAB-CMCOP-17-2016
 TERMINACION DE CANCHA M: FUNCIONAL
 UBICADA EN BOULEVARD PRINCIPAL 100 M DE LA
 ESCUELA PRIMARIA LOCALIDAD EIJO LA ALMITA,
 MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
 UBICACION: CABORCA, SONORA

FECHA 27 de septiembre de 2016
 ESTIMACION N° 1
 PERIODO DE ESTIMACION
 DEL 15/08/2016 AL 20/09/2016

CLAVE	CONCRETOS EJECUTADOS	AREA	ENTRE	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	PZAS.	CARAS	FORMULA	TOTAL	UNIDAD
5	INSTALACION DE CABLE 2+1 CAL 6 awg, INCLUYE: EXCAVACION, POLIDUCTO, CABLEADO, GUIA, CONEXIONES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO			21.00						21.00	
				16.00						16.00	
				18.00						18.00	
				18.00						18.00	
				16.00						16.00	
									TOTAL	89.00	ML

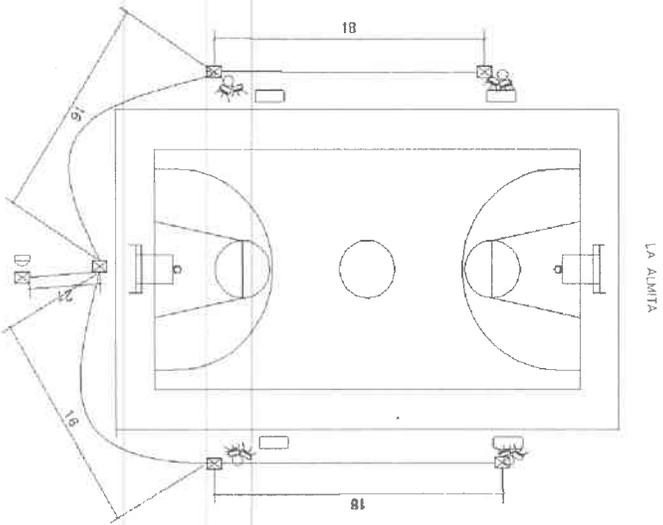

- SIMBOLOGIA**
- HERRAJES
 - HERRAJES EN BARRAS
 - HERRAJES EN BARRAS DE CEMENTO
 - HERRAJES EN BARRAS DE CEMENTO
 - HERRAJES EN BARRAS DE CEMENTO
 - HERRAJES EN BARRAS DE CEMENTO

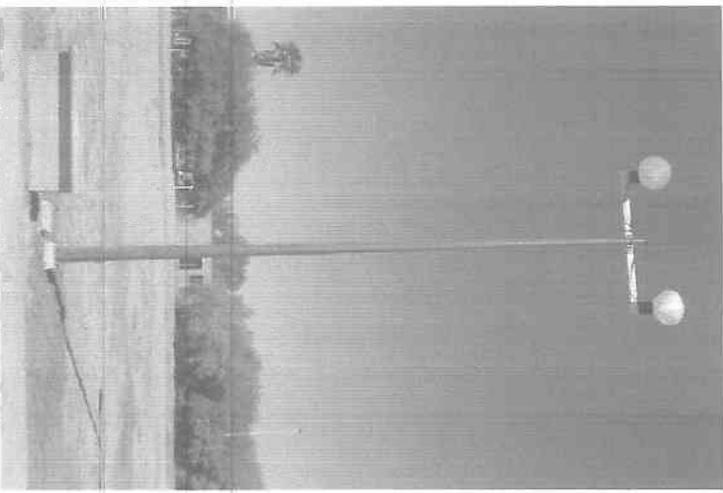

OBSERVACIONES GENERALES:

CONTRATISTA

MARIBIETA SOLUCIONES S.A. DE C.V.

SUPERVISOR DE OBRA


C. DULCE ALEJANDRA MARILES GUERRERO

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO N° CAB-CMICOP-17-2016
 TERMINACION DE CANCHA M. N. FUNCIONAL
 UBICADA EN BOULEVARD PRINGIPALA 100 M DE LA
 ESCUELA PRIMARIA LOCALIDAD EJIDO LA ALMITA,
 MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.
 UBICACION: CABORCA, SONORA

FECHA 27 de septiembre de 2016
 ESTIMACION N° 1
 PERIODO DE ESTIMACION
 DEL 15/08/2016 AL 20/09/2016

CLAVE	CONCEPTOS EJECUTADOS	AREA	ENTRE	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	PZAS.	CARAS	FORMULA	TOTAL	UNIDAD
		6	REGISTRO DE CONCRETO PARA ALUMBRADO CON TAPA DE 30x40, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECUCION						6		
TOTAL										6.00	PZA

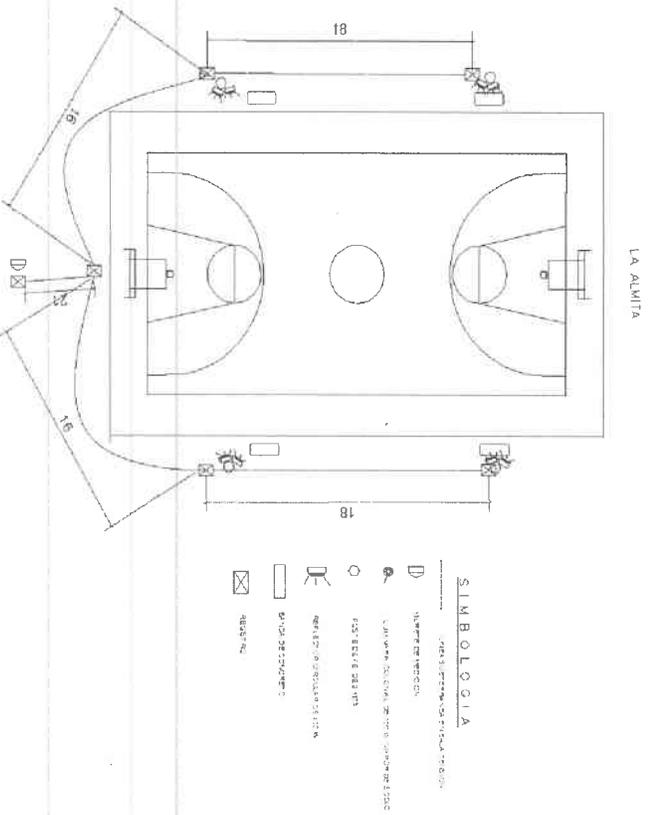

OBSERVACIONES GENERALES:

CONTRATISTA

MARRIETA SOLUCIONES S.A. DE C.V.

SUPERVISOR DE OBRA

C. DULCE ALEJANDRA MARILES GUERRERO

REGISTRO DE FIRMAS

NUMERO Y NOMBRE DE LA OBRA

Terminacion de cables multiconductor
Ubicado en Bldv. Principal en el Ejido
Lo Plástico

contacto

(AR-CRCP-17-21)

SUPERVISION

CONTRATISTAS

MURRAY SOLDADORES S.A DE C.V.
Luis Ferrer Alvarez


Vº Bº. PATRON

Vº Bº. SUPERVISION

Vº Bº. COORDINACION


BIT 1 15/08/16

El día de hoy iniciamos con la obra referente al concreto
CAR-CARP-17-206. Se insertan los fidejos con la construcción
de decks de concreto para la colocación de estructura de
parterres, incluye todo lo necesario para su concreto
estructural.




BIT 2 25/08/16

El día de hoy continuamos con el suministro y colocación
de placa de acero para recibir parterres, incluye: negro
de obra, equipo y todo lo necesario para su concreto
estructural.



NOTA 3 29/08/16

Trabaja hoy con el suministro e instalación de estructuras de góndolas a base de tubo estructural de 3" incluye todo lo necesario para su montaje y pintura.



NOTA 4 25/09/16

Hoy comenzamos con la instalación de góndolas metálicas para el montaje de góndolas metálicas y equipo.

Trabajo de día.

