

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA RECIBO DE ESTIMACIONES

OBRA : TERMINACION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL UBICADA EN CALLE 1RA ENTRE AVENIDAS F Y G **FECHA:** 18/10/2016 **POR OBRA EJECUTADA:** DE : 21/09/2016 **A:** 17/10/2016
 FRENTE A ESCUELA PRIMARIA PLUTARCO ELIAS CALLES LOCALIDAD ELIDO SAN FELIPE, **UBICACION:** CABORCA, SONORA
 MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.




CONCEPTO: OBRA NORMAL **ESTIMACION No.:** 2 **RECIBIMOS DEL : GOBIERNO MUNICIPAL DE CABORCA, SONORA** 46,846.32 **TIPO DE INVERSION**

NO. DE CONTRATO	FECHA	IMPORTE S/IVA	ANTICIPO S/IVA	INICIO	TERMINO	FISICO	FINANCIERO
CAB-CMCOP-11-2016	15/08/2016	\$ 227,832.50	\$ 68,349.75	15/08/2016	17/10/2016	100%	100%

FIANZA DE ANTICIPO No.: 0
FIANZA DE CUMPLIMIENTO No.: 0

ESTADO DE CUENTA DE ANTICIPO (NO INCLUYE IVA)		LIQUIDACION		ESTADO DE CUENTA DE CONTRATO (NO INCLUYE I.V.A.)	
AMORTIZ. ACUM. ANTERIOR	\$ 50,945.54	IMPORTE ESTIMACION	\$ 58,014.02	ESTA ESTIMACION	\$ 58,014.02
AMORTIZ. EN ESTA ESTIMACION	\$ 17,404.21	AMORT. ANTICIPO	\$ 17,404.21	ACUM. ANTERIOR	\$ 169,818.48
AMORTIZADO TOTAL	\$ 68,349.75	SUBTOTAL	\$ 40,609.81	ACUM. TOTAL	\$ 227,832.50
ANTICIPO OTORGADO	\$ 68,349.75	IVA	\$ 6,497.57	MONTO ASIGNADO AL CONTRATO	\$ 227,832.50
SALDO	\$ 0.00	TOTAL	\$ 47,107.38		
		DEDUCCIONES			
		I.C.I.C. 2%	\$ 116.03		
		INSP. Y VIGILANCIA 2%	\$ 116.03		
		UNISON 10% (S.I.V.)	\$ 11.60		
		CECOP 15% (S.I.V.)	\$ 17.40		
		SUMA DE DEDUCCIONES	\$ 261.06		
		BUENO POR	\$ 46,846.32		

FORMULARON EL CONTRATISTA **SUPERVISOR** **COORDINADOR CM COP** **APROBARON** PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SAMUEL MURRIETA BELARANO  C. DULCE ALEJANDRA MARILES GUERRERO  C. LUIS ARTURO ORTEGA DUENAS  Q.B. KARINA GARCIA GUTIERREZ

TIPO DE OBRA DE LA ESTIMACION

FT16

OBRA : TERMINACION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL UBICADA EN CALLE 1RA ENTRE AVENIDAS F Y G FRENTE A ESCUELA PRIMARIA PLUTARCO ELIAS CALLES LOCALIDAD EJIDO SAN	CONCEPTO: OBRA NORMAL ESTIMACION N° 2 RECIBIMOS DEL: LA CANTIDAD DE: \$46,846.32
FECHA : 18 de octubre de 2016 UBICACION : CABORCA, SONORA	DEL: 21/09/2016 AL: 17/10/2016 POR OBRA EJECUTADA :

No.	TIPO DE TRABAJO	IMPORTE	OBSERVACIONES
	SUBTOTAL HOJA 1	\$ 53,265.08	
	SUBTOTAL HOJA 2	-	
	SUBTOTAL HOJA 3	\$ 4,748.94	
	SUMA \$	58,014.02	

IMPORTE DE OBRA : 58,014.02 AMORTIZACION DE ANTICIPO : 17,404.21 SUBTOTAL : 40,609.81 I.V.A. DEDUCCIONES I.C.I.C. .2 % 116.03 INSP. Y VIGILANCIA .2 % 116.03 UNISON 10 % (S.I.V.) 11.60 CECOP 15 % (S.I.V.) 17.40 ALCANCE LIQUIDO : 46,846.32	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> FORMULARON C. DULCE ALEJANDRA MARILES GUERRERO SUPERVISOR </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> CONTRATISTA C. SAMUEL MURRIETA BEJARAMO COORDINADOR CIMCOP </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">APROBARON</td> <td style="text-align: center;"> C. LUIS ARTURO ORTEGA DUENAS COORDINADOR CIMCOP </td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">Q.B. KARINA GARCIA GUTIERREZ PRESIDENTA MUNICIPAL</p>	FORMULARON C. DULCE ALEJANDRA MARILES GUERRERO SUPERVISOR	CONTRATISTA C. SAMUEL MURRIETA BEJARAMO COORDINADOR CIMCOP	APROBARON	C. LUIS ARTURO ORTEGA DUENAS COORDINADOR CIMCOP
FORMULARON C. DULCE ALEJANDRA MARILES GUERRERO SUPERVISOR	CONTRATISTA C. SAMUEL MURRIETA BEJARAMO COORDINADOR CIMCOP				
APROBARON	C. LUIS ARTURO ORTEGA DUENAS COORDINADOR CIMCOP				

CONTRC ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

FT17

OBRA : TERMINACION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL UBICADA EN CALLE 1RA ENTRE AVENIDAS F Y G FRENTE A ESCUELA PRIMARIA PLUTARCO ELIAS CALLES LOCALIDAD EJIDO SAN FELIPE, MUNICIPIO DE CABORCA SONORA	FECHA : 18/10/2016	UBICACION : CABORCA, SONORA
CONCEPTO : OBRA NORMAL	2	IMPORTE DE ESTIMACION : \$ 58,014.02
Nº DE CONTRATO	FECHA	IMPORTE S/IVA
CAB-CMCOP-11-2016	15/08/2016	\$227,832.50
		ANTICIPO S/IVA
		\$68,349.75
	INICIO	TERMINO
	15/08/2016	17/10/2016
	FISICO	FINANCIERO
	100%	100%
	TIPO DE INVERSION	
	ESTATAL	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PRESUPUESTO	CANTIDADES DE OBRA		ESTA ESTIMACION	P. UNITARIO	IMPORTE
				ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR			
1	DADO DE CONCRETO DE SECCION 20X20 C. DE ALTURA VARIABLE, PARA COLOCACION DE ESTRUCTURA DE GRADAS CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DE 1/2" Y ESTRIBOS CON VARILLA DE 1/4" @ 20 CM, CIMBRA COMUN, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, COLADO, VIBRADO, CURADO Y DESCIMBRA, INCLUYE GANCHOS, ESCUADRAS, CRUCES Y DESPERDICIOS.	PZA	4.00	0.00	0.00	2.00	1,342.90	\$ -
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO DE SECCION 20X20CM DE 3/8" DE ESPESOR PARA RECIBIR ESTRUCTURA DE PORTERIA Y GRADAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.00	0.00	0.00	2.00	1,201.26	\$ -
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE PORTERIA A BASE DE TUBO ESTRUCTURAL DE 3" DE 3.0 X 2.08 , ANCLAJE A LOSA.; DE ALTA RESISTENCIA O SIMILARES, AROS METALICOS REGLAMENTARIOS CON RED.	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	26,632.54	\$ 53,265.08
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO PARA ALUMBRADO DE 8 MTS, INCLUYE: OPSTE, BASE DE CONCRETO, CRUCETA, 2 LAMPARAS DE ADITIVO METALICO DE 1000w, CABLEADO EN EL INTERIOR DEL POSTE Y EN LAS LAMPARAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	4.00	0.00	0.00	2.00	19,975.41	\$ -
ESTA HOJA								\$ 53,265.08

CONTRATISTA

SUPERVISOR

MURRIETA SOLUCIONES S.A. DE C.V.

C. DULCE ALEJANDRA MARILES GUERRERO

PRESIDENTE MUNICIPAL

COORDINADOR CMCOP CABORCA

Q.B. KARINA GARCIA GUTIERREZ

C. LUIS ARTURO ORTEGA DUEÑAS

POR EL MUNICIPIO DE CABORCA

CONTRATO ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

FT17


OBRA : TERMINACION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL UBICADA EN CALLE 1RA ENTRE AVENIDAS F Y G **FECHA :** 18/10/2016 **POR OBRA EJECUTADA :**

FRONTE A ESCUELA PRIMARIA PLUTARCO ELIAS CALLES LOCALIDAD EJIDO SAN FELIPE, MUNICIPIO DE CABORCA SONORA **UBICACION :** CABORCA, SONORA **DE :** 21/09/2016 **A :** 17/10/2016

CONCEPTO: OBRA NORMAL **ESTIMACION N°** 2 **IMPORTE DE ESTIMACION :** \$ 58,014.02

N° DE CONTRATO	FECHA	IMPORTE S/IVA	ANTICIPO S/IVA	INICIO	TERMINO	FISICO	FINANCIERO	TIPO DE INVERSION
CAB-CMCOPI-11-2016	15/08/2016	\$227,832.50	\$68,349.75	15/08/2016	17/10/2016	100%	100%	ESTATAL


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	P. UNITARIO	IMPORTE
8	FABRICACION DE BANCA DE 1.60 MTS DE LARGO A BASE ASIENTO DE LOSA DE CONCRETO DE 0.40 MTS DE ANCHO Y 10 CM DE ESPESOR, DESPLANTADA SOBRE ZAPATA CORRIDA DE 0.40 MTS DE ANCHO Y 0.15 CM DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8, MUERETE DE BLOCK REFORZADO CON VAR VERTICALES DE 3/8 Y CELDAS COLADAS CON CONCRETO, MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	4.00	0.00	0.00	1.00	6,806.03 \$	4,748.94 \$
9	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA	LOTE	1.00	1.00	0.00	1.00	4,748.94 \$	4,748.94 \$
ESTA HOJA \$								4,748.94

CONTRATISTA

MURRIETA SOLUCIONES S.A. DE C.V.

SUPERVISOR
C. DULCE ALEJANDRA MARILES GUERRERO

POR EL MUNICIPIO DE CABORCA

PRESIDENTE MUNICIPAL
Q.B. KARINA GARCIA GUTIERREZ



COORDINADOR CMCOPI CABORCA

C. LUIS ABTURO ORTEGA DUEÑAS

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO N° CAB-CMCO P-11-2016
 TERMINACION DE CANCHA MUJERES JUNCIONAL
 UBICADA EN CALLE 1RA ENTRE AVENIDAS F Y G
 FRENTE A ESCUELA PRIMARIA PLUTARCO ELIAS
 CALLES LOCALIDAD EJIDO SAN FELIPE, MUNICIPIO DE
 UBICACION: CABORCA, SONORA

FECHA 18 de octubre de 2016
 ESTIMACION N° 2
 PERIODO DE ESTIMACION
 DEL 15/08/2016 AL 17/10/2016

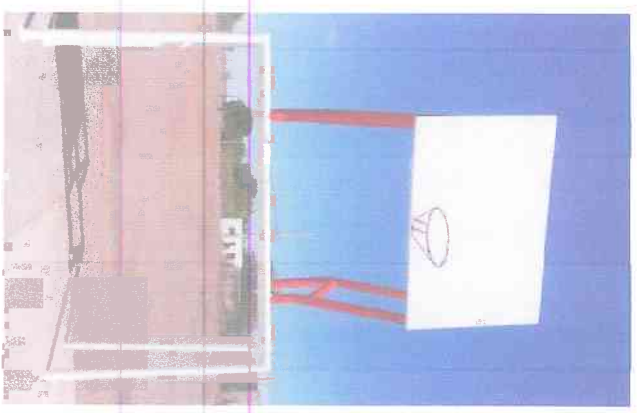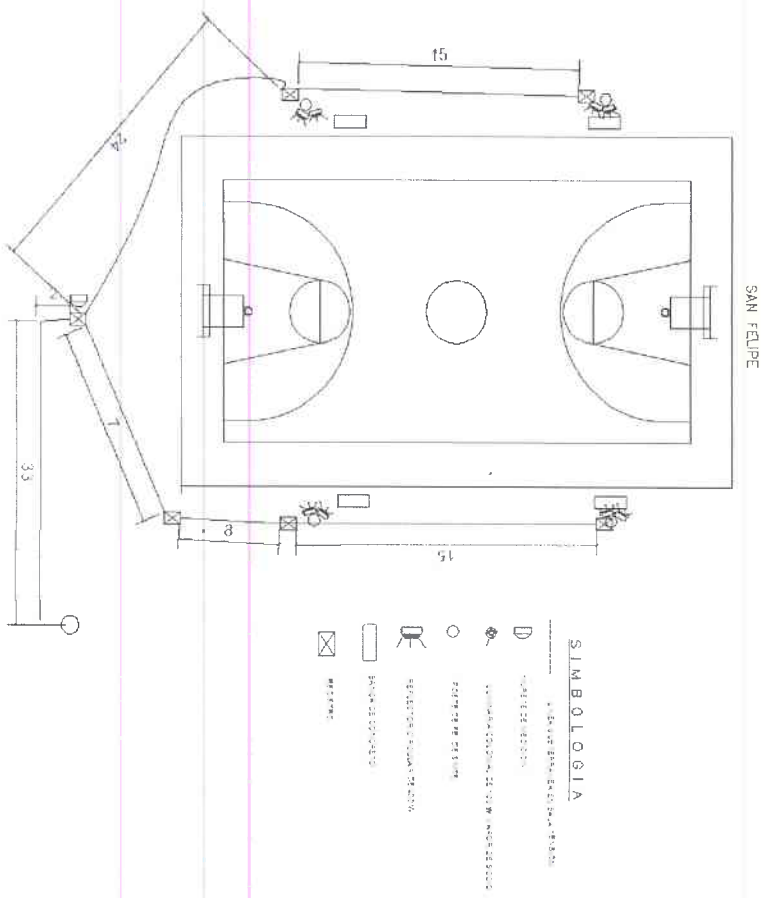CLAVE	CONCEPTOS EJECUTADOS	EJE	ENTRE	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	PZAS.	CARAS	OBSERVACIONES	TOTAL	UNIDAD
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE PORTERIA A BASE DE TUBO ESTRUCTURAL DE 3" DE 3.0 X 2.08 , ANCLAJE A LOSA.; DE ALTA RESISTENCIA O SIMILARES, AROS METALICOS REGLAMENTARIOS CON RED.						2			2.00	
TOTAL										2.00	PZA



OBSERVACIONES GENERALES:

CONTRATISTA

MURRETAS SOLUCIONES S.A. DE C.V.

SUPERVISOR DE OBRA


C. DULCE ALEJANDRA MARILES GUERRERO

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO N° CAB-CM/COP-11-2016
 TERMINACION DE CANCHA MUNICIPAL
 UBICADA EN CALLE 1RA ENTRE AVENIDAS F Y G
 FRENTE A ESCUELA PRIMARIA PLUTARCO ELIAS
 CALLES, LOCALIDAD ELIDO SAN FELIPE, MUNICIPIO DE
 UBICACION: CABORCA, SONORA

FECHA 18 de octubre de 2016
 ESTIMACION N° 2
 PERIODO DE ESTIMACION
 DEL 15/08/2016 AL 17/10/2016

CLAVE	CONCEPTOS EJECUTADOS	AREA	ENTRE	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	PZAS.	CLARO	OBSERVACIONES	TOTAL	UNIDAD
9	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA						1			1.00	
TOTAL										1.00	LOTE

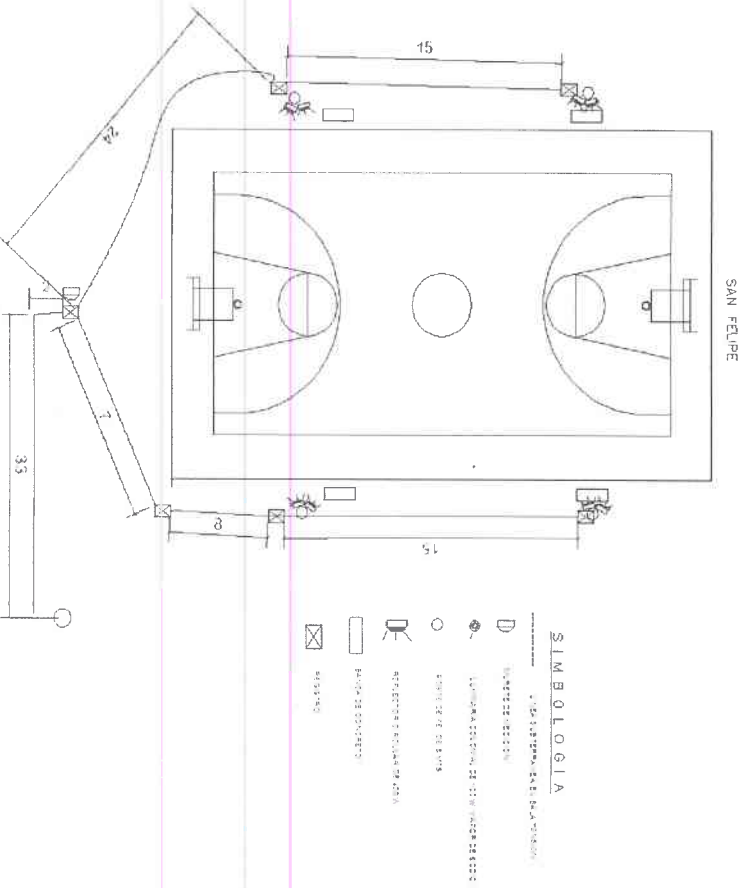

OBSERVACIONES GENERALES:

MURRIETA SOLUCIONES S.A. DE C.V.


CENTRATISTA

SUPERVISOR DE OBRA

C. DULCE ALEJANDRA MARILES GUERRERO


PARTE 15109116

Hay comentarios con la instalación de cable 2H col. G. aug incluye excavación, golido, celdado y todo lo necesario para su correcta ejecución.



DATA 23/09/16

Hay comentarios con la ubicación de acorehido completa incluye material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.



Nota 3 13/10/16

Hay generadores con la construcción de bases de concreto a base de base de concreto incluye todo lo necesario para su correcta ejecución



Nota 5 13/10/16

Fstedia se concluyen los trabajos con la limpieza final de la obra referidos en el contrato CAB-TUCAL-11-2016 en el cual se encuentran ejecutados los conceptos al 100% y se citara la presente billete de trabajo

