



**PROGRAMA ESTATAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
PARA LA OBRA PÚBLICA CONCERTADA**



**COMPARATIVO DE PROGRAMA DE OBRA
PROGRAMADA - EJECUTADA**


MUNICIPIO DE: H. CABORCA SON

OBRA:	NUM. DE CONTRATO: CAB - CMCOP - 06 - 2015										LOCALIDAD:	CABORCA
	PERIODO DE TIEMPO (SEMANA)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	% DEL TOTAL	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SAN FELIPE ENTRE AVENIDAS O Y P EN CABORCA.												
TIEMPO PROGRAMADO DEL 15 DE DIC. DE 2015 AL 11 DE ENERO DE 2016												100.00
TIEMPO EJECUTADO DEL 15 DE DIC. DE 2015 AL 24 DE DIC. DEL 2015												100.00
AVANCE FÍSICO (%)												100%


COORDINADOR CMCOP
C. LUIS ARTURO ORTEGA DUEÑAS

OBRA: AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE SAN FELIPE ENTRE AVS. O Y P
 EN LA LOCALIDAD DE CABORCA
 LOCALIDAD: CABORCA
 MUNICIPIO: H. CABORCA, SON.
 CONTRATO: NO. CAB - CMCOP - 06 - 2015

GRAFICA DE OBRA PROGRAMADA

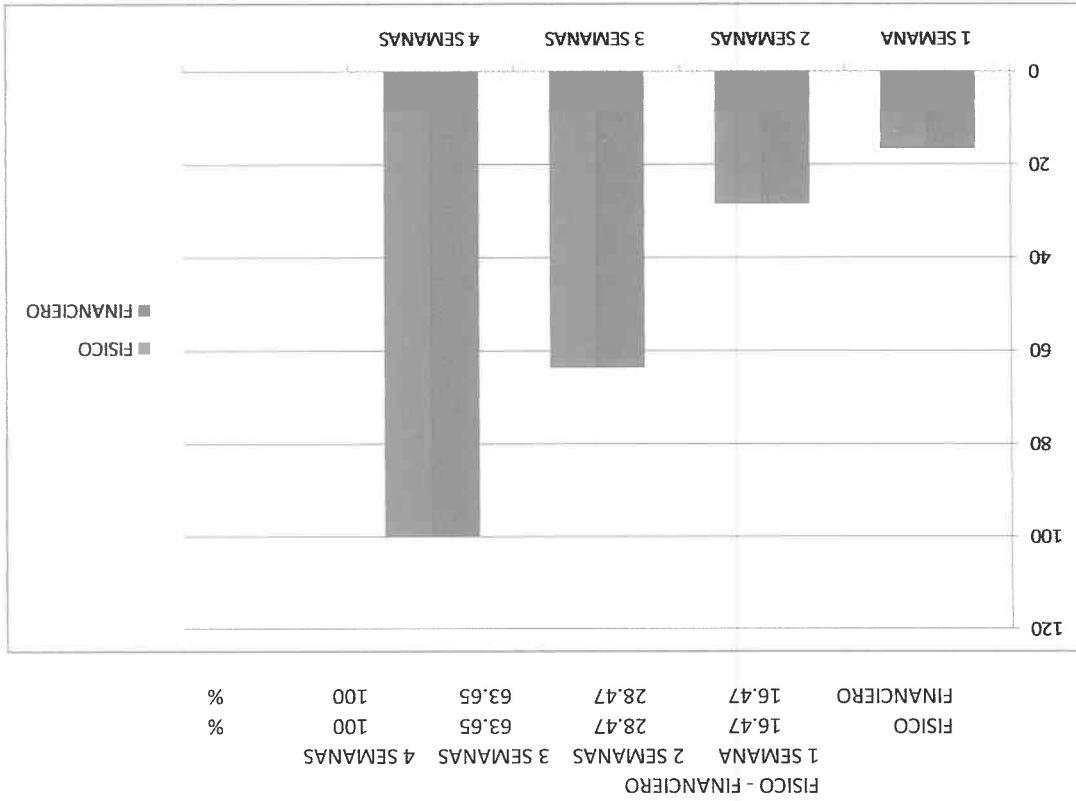

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SAN FELIPE ENTRE AV. O Y P
 EN LA LOCALIDAD DE CABORCA SONORA
 LOCALIDAD: CABORCA
 MUNICIPIO: H. CABORCA, SON.
 CONTRATO NO. CAB - CMCOP - 06 - 2015

GRAFICA DE AVANCE REAL


FISCO - FINANCIERO

1 SEMANA 2 SEMANA

FISCO 313,611.27 313,611.27

FINANCIERO 94,083.38 313,611.27

30% ANTICIPO

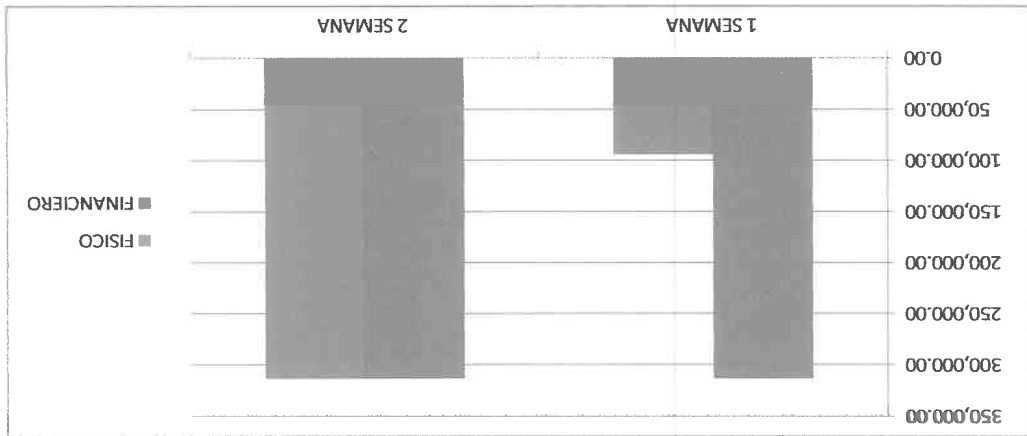

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

MES DE DICIEMBRE DEL 2015

CONTRATO: CAB – CM COP – 06 – 2015

FECHA: 28 DE DICIEMBRE DE 2015

POR ESTE CONDUCTO ME PERMITO INFORMAR EL AVANCE DE OBRA REFERENTE A LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SAN FELIPE ENTRE AVENIDAS O Y P LOCALIDAD H. CABORCA SON.

SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100 %, EN ESTA OBRA SE TERMINARON LOS TRABAJOS EL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2015, Y SE TENIA PROGRAMADA SU TERMINACION EL DIA 11 DE ENERO DEL 2016.

LA EMPRESA CONTRATADA PARA ESTA OBRA ES ALUMBRADO Y SUMINISTROS DE CABORCA, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR C. MIGUEL PARRA ABOYTE.

REPORTE ELABORADO POR LA SUPERVISION DE LAS OBRAS DE CM COP.

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

MES DE DICIEMBRE DEL 2015

CONTRATO: CAB – CM COP – 06 – 2015

FECHA: 28 DE DICIEMBRE DE 2015

POR ESTE CONDUCTO ME PERMITO INFORMAR EL AVANCE DE OBRA REFERENTE A LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SAN FELIPE ENTRE AVENIDAS O Y P LOCALIDAD H. CABORCA SON.

SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100 %, EN ESTA OBRA SE TERMINARON LOS TRABAJOS EL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2015, Y SE TENIA PROGRAMADA SU TERMINACION EL DIA 11 DE ENERO DEL 2016.

LA EMPRESA CONTRATADA PARA ESTA OBRA ES ALUMBRADO Y SUMINISTROS DE CABORCA, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR C. MIGUEL PARRA ABOYTE.

REPORTE ELABORADO POR LA SUPERVISION DE LAS OBRAS DE CM COP.
