

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA

RECIBO DE ESTIMACIONES

OBRA :		CONSTRUCCION DE TEABAN METALICO EN CANCHA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA 6 DE ABRIL DOMICILIO CALLE 8 ENTREVENIDAS G Y H LOCALIDAD DE H. CABORCA, MUNICIPIO DE		FECHA:	18/10/2016	POR OBRA EJECUTADA:	DE :	21/09/2016	A :	17/10/2016	
CONCEPTO:		OBRA NORMAL		UBICACION:	CABORCA, SONORA						
NO. DE CONTRATO	FECHA	IMPORTE S/IVA	ESTIMACION No. 2	RECIBIMOS DEL : GOBIERNO MUNICIPAL DE CABORCA, SONORA							
CMCOP-10-2016	15/08/2016	\$ 469,615.52	\$ 140,884.66	LA CANTIDAD DE :	\$	FINANCIERO					
				INICIO	15/08/2016	TERMINO	17/10/2016	FISICO	100%	FINANCIERO	100%
				TIPO DE INVERSION							
				FIANZA DE ANTICIPO No. :	0						
				FIANZA DE CUMPLIMIENTO No.:	0						

ESTADO DE CUENTA DE ANTICIPO (NO INCLUYE IVA)		LIQUIDACION		ESTADO DE CUENTA DE CONTRATO (NO INCLUYE I.V.A.)	
AMORTIZ. ACUM. ANTERIOR	\$ 132,371.29	IMPORTE ESTIMACION	\$ 27,043.54	ESTA ESTIMACION	\$ 27,043.54
AMORTIZ. EN ESTA ESTIMACION	\$ 8,113.06	AMORT. ANTICIPO	\$ 8,113.06	ACUM. ANTERIOR	\$ 441,237.64
AMORTIZADO TOTAL	\$ 140,484.35	SUBTOTAL	\$ 18,930.48	ACUM. TOTAL	\$ 468,281.18
ANTICIPO OTORGADO	\$ 140,884.66	IVA	\$ 3,028.88	ACUM. ASIGNADO AL CONTRATO	\$ 469,615.52
		TOTAL	\$ 21,959.36		
		DEDUCCIONES			
		I.C.I.C. 2%	\$ 54.09		
		INSP. Y VIGILANCIA 2%	\$ 54.09		
		UNISON 10% (S.I.V.)	\$ 5.41		
		CECOP 15% (S.I.V.)	\$ 8.11		
SALDO	\$ 400.31	SUMA DE DEDUCCIONES	\$ 121.70	SALDO	\$ 1,334.34
		BUENO POR	\$ 21,837.66		

EL CONTRATISTA C. SAMUEL MURRIETA BEJARANO	SUPERVISOR C. DULCE ALEJANDRA MARILES GUERRERO	FORMULARON COORDINADOR CMCOP C. LUIS ARTURO ORTEGA DUEÑAS
PRESIDENTA MUNICIPAL Q.B. KARINA GARCIA GUTIERREZ	APROBARON	




TIPO DE OBRA DE LA ESTIMACION

FT16

OBRA : CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO EN CANCHA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA 6 DE ABRIL DOMICILIO CALLE 8 ENTREAVENIDAS G Y H LOCALIDAD DE H. CABORCA, MUNICIPIO FECHA : 18 de octubre de 2016 UBICACION : CABORCA, SONORA	CONCEPTO: OBRA NORMAL ESTIMACION N° 2 RECIBIMOS DEL : LA CANTIDAD DE: \$21,837.66
DEL: 21/09/2016 AL: 17/10/2016 POR OBRA EJECUTADA :	

No.	TIPO DE TRABAJO	IMPORTE	OBSERVACIONES
	SUBTOTAL HOJA 1	\$ -	
	SUBTOTAL HOJA 2	\$ -	
	SUBTOTAL HOJA 3	\$ -	
	SUBTOTAL HOJA 4	\$ -	
	SUBTOTAL HOJA 5	\$ 27,043.54	

IMPORTE DE OBRA :	27,043.54	SUMA \$	27,043.54
AMORTIZACION DE ANTICIPO :	8,113.06		
SUBTOTAL :	18,930.48		
DEDUCCIONES			
I.V.A.	3,028.88		
L.C.I.C. 2 %	54.09		
INSP. Y VIGILANCIA 2 %	54.09		
UNISON 10 % (S.I.V.)	5.41		
CECOP 15 % (S.I.V.)	8.11		
ALCANCE LIQUIDO :	21,837.66		

CONTRATISTA C. SAMUEL MURRIETA BEJARANO 	FORMULARON C. DULCE ALEJANDRA MARILES GUERRERO 
COORDINADOR CM COP C. LUIS ARTURO ORTEGA DUENAS 	APROBARON PRESIDENTA MUNICIPAL Q.B. KARINA GARCIA GUTIERREZ

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

FT17


OBRA : CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO EN CANCHA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA 6 DE ABRIL DOMICILIO CALLE 8 ENTREAVENIDAS G Y H LOCALIDAD DE H. CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA SONORA		FECHA : 18/10/2016	POR OBRA EJECUTADA :					
		UBICACION : CABORCA, SONORA	DE : 21/09/2016	A : 17/10/2016				
CONCEPTO : OBRA NORMAL	ESTIMACION N° 2	IMPORTE DE ESTIMACION : \$	27,043.54					
N° DE CONTRATO	FECHA	IMPORTE S/IVA	ANTICIPO S/IVA	INICIO	TERMINO	FISICO	FINANCIERO	TIPO DE INVERSION
CMCOP-10-2016	15/08/2016	\$469,615.52	\$140,884.66	15/08/2016	17/10/2016	100%	100%	ESTATAL

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PRESUPUESTO	CANTIDADES DE OBRA		ESTA ESTIMACION	P. UNITARIO	IMPORTE	
				ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR				
EST06.	Larguero para rigidización de marco a base de polin 8x8 cal.12 en cajon; incluye: suministró de material, primer anticorrosivo, dos manos de pintura de esmalte, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su colocación.	MIL	16.50	0.00	0.00	0.00	545.16	\$ -	
EST07.	Cubierta a base de lámina galvanizada de 14' y 12' R-72 cal.26; Incluye: tuercas, pijas autorroscantes de 3/4" x 1/8", suministró y colocación de material, herramienta y mano de obra, altura hasta 6 M.	M2	352.00	0.00	0.00	0.00	363.80	\$ -	
EST08.	Separador a base de redondo liso de 3/8" de 1.20 m. de longitud aprox., con cuerda maquinada de 10 cm. y tuerca en un extremo, primer anticorrosivos y dos manos de pintura de esmalte; incluye: suministró, colocación, cortes, desperdicios y primer anticorrosivo.	PZA	112.00	48.00	0.00	48.00	97.48	\$ 4,679.04	
EST09.	Limpieza durante y al final de la obra	lote	1.00	1.00	0.00	1.00	5,445.78	\$ 5,445.78	
FP01	Contravientos a base de redondo liso de 3/4" de 11.70 M. de longitud, con cuerda maquinada de 10 Cm. y tuerca en un extremo, incluye suministró, colocación cortes, desperdicios, primer anticorrosivo y dos manos de pintura de esmalte.	PZA	16.00	16.00	0.00	16.00	\$ 1,057.42	\$ 16,918.72	
CONTRATISTA							SUPERVISOR		
MURRIETA SOLUCIONES S.A. DE C.V.							C. DULCE ALEJANDRA MARILES GUERRERO		
PRESIDENTE MUNICIPAL							COORDINADOR CMCOP CABORCA		
Q.B. KARINA GARCIA GUTIERREZ							C. LUIS ARTURO ORTEGA DUEÑAS		
POR EL MUNICIPIO DE CABORCA							ESTA HOJA \$ 27,043.54		

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO N° CM COP-10-2016	FECHA 18 de octubre de 2016
CONSTRUCCION DE TELABAN N° ALICO EN CANCHA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA DE ABRIL DOMICILIO CALLE 8 ENTRE AVENIDAS G Y H LOCALIDAD DE H. CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA	ESTIMACION N° 2
UBICACION: CABORCA, SONORA	PERIODO DE ESTIMACION
	DEL 15/08/2016 AL 17/10/2016

CLAVE	CONCEPTOS EJECUTADOS	AREA	ENTRE	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	PZAS.	CLAROS	OBSERVACIONES	TOTAL	UNIDAD
EST08.	Separador a base de redondo liso de 3/8" de longitud aprox., con cuerda maquinada de 10 cm. y tuerca en un extremo, primer anticorrosivos y dos manos de pintura de esmalte; incluye: suministro, colocación, cortes, desperdicios y primer anticorrosivo.						12	4.00		48.00	
TOTAL										48.00	PZA

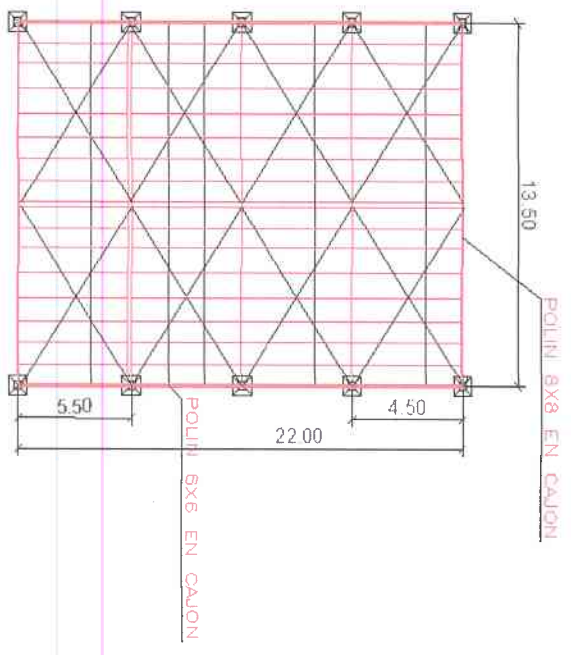



OBSERVACIONES GENERALES:	CONTRATISTA	SUPERVISOR DE OBRA
	MURRIETA SOLUCIONES S.A. DE C.V.	C. DULCE ALEJANDRA MARILES GUERRERO

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO N° CMCOP-10-2016
 CONSTRUCCION DE TEJABAN N° 1 ALICO EN CANCHA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA DE ABRIL DOMICILIO CALLE 8 ENTREAVENIDAS G Y H LOCALIDAD DE H. CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
 UBICACION: CABORCA, SONORA

FECHA 18 de octubre de 2016
 ESTIMACION N° 2
 PERIODO DE ESTIMACION
 DEL 15/08/2016 AL 17/10/2016

CLAVE	CONCEPTOS EJECUTADOS	AREA	ENTRE	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	PZAS.	CARAS	OBSERVACIONES	TOTAL	UNIDAD
EST09.	Limpieza durante y al final de la obra						1			1.00	
									TOTAL	1.00	lote

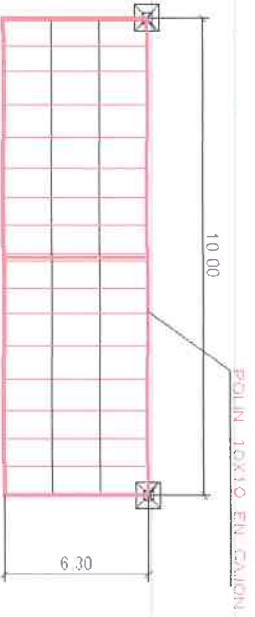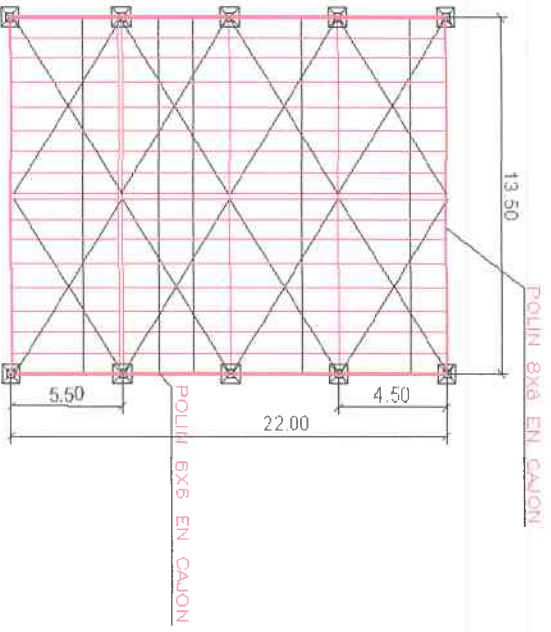

OBSERVACIONES GENERALES:

CONTRATISTA

MURRIETA SOLUCIONES S.A. DE C.V.

SUPERVISOR DE OBRA

C. DULCE ALEJANDRA MARILES GUERRERO


Fecha 08/07/2016

El día de hoy comencamos con los trabajos de revoque a la capa de $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ en la totalidad lo necesario para su trabajo y revoque.




Fecha 8/11/2016

Este día comencamos con la construcción de detalles de concreto de sección $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ incluye todo lo necesario para el concreto que se usará de los trabajos




Plan 7 22/07/2016

El día de hoy trabajamos con los techos de columnas de greda y cobocan de marcos a base de columnas de greda y 8x8 col. 14 y polin por lo tanto en caso de incluir todo lo necesario para su correcta ejecución.



Plan 10 30/07/2016

El día de hoy trabajamos con los techos de instalaciones de vigueras para rigidizarlas de marcos a base de polin 6x6 col. 14 Sencillo y polin bajo col. 12 y polin 8x8 col. 12 incluir todo lo necesario para su correcta ejecución.




Obra 11 26/09/2016

Se dio comienzo con la colocación de zapatas
alrededor tipo de 3/8" incluye todo lo necesario
por si correte gusan



Obra 12 03/10/2016


El día de hoy empezamos con la colocación de canchales
en base de redondo tipo de 3/4" incluye todo
lo necesario por si correte gusan



MAÑ 13 05/10/2016
 El día de hoy continuamos con la aplicación de
 pintura en todo la estructura incluir todo lo neces-
 ario para su correcta aplicación



MAÑ 14 09/10/2016
 Hay concretamos con la instalación de cables a
 los de largo solicitados de 14' y 17" R 72 ca. 1.25
 incluir lo necesario para su correcta ejecución.

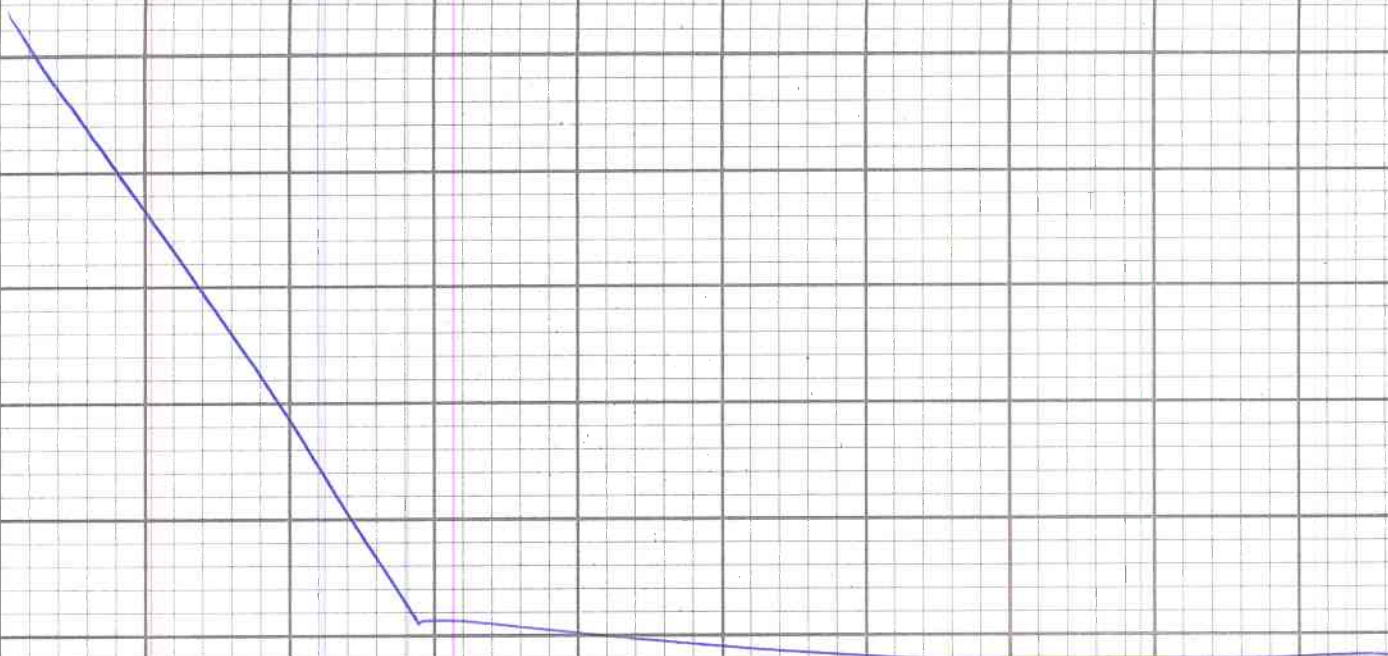

DATA IS 17/10/2016

Este día se concluyen los trabajos referidos en el Contrato CUCOP-10-2016 con la limpieza final de la obra en el cual se encuentran concluidos los conceptos al 100%. Y se anexa la bitácora de obra

