


OBRA: CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA JORGE ALFONSO
 CORELLA VALLES
 LOCALIDAD: EJIDO YAQUI JUSTICIERO
 MUNICIPIO: H. CABORCA, SON.
 CONTRATO NO. CAB - CMCOP - 07 - 2016

GRAFICA DE OBRA PROGRAMADA

FISICO - FINANCIERO

PORCENTAJE	1 SEMANA	2 SEMANAS	3 SEMANAS	4 SEMANAS	5 SEMANAS	6 SEMANAS	7 SEMANAS	8 SEMANAS
FISICO	5	15	30	45	65	80	95	100
FINANCIERO	30	45	60	70	80	90	95	100

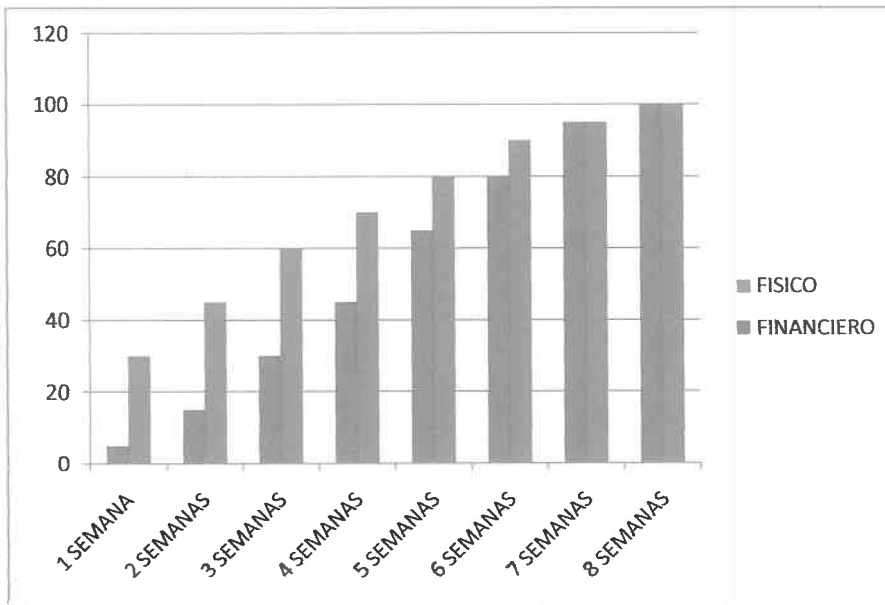


OBRA: CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA JORGE ALFONSO
CORELLA VALLES
LOCALIDAD: EJIDO YAQUI JUSTICIERO
MUNICIPIO: H. CABORCA, SON.
CONTRATO NO. CAB - CMCOP - 07 - 2016

GRAFICA DE AVANCE REAL

FISICO - FINANCIERO

	2 SEMANAS	4 SEMANAS
FISICO	165,603.83	223,182.42
FINANCIERO	182,877.41	223,182.42

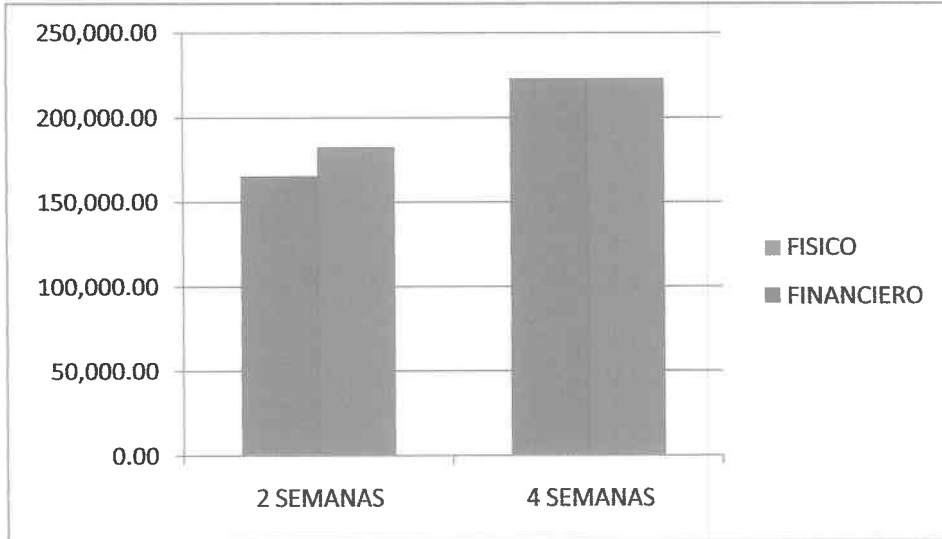

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

MES DE ENERO DEL 2016

CAB- CMCOP-07-2016

FECHA: 01 DE FEBRERO DE 2016


REFERENTE A LAS OBRA: CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA JORGE ALFONSO CORELLA VALLES, EN EJIDO YAQUI JUSTICIERO,BAJO CONTRATO No. CAB-CMCOP-07-2016, DE FECHA 13 DE ENERO DE 2016,SE TIENE EL SIGUIENTE AVANCE DE OBRA:

SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 75% EN LA CONSTRUCCION TOTAL DEL TEJABAN; SE TIENE TERMINADA LA CONSTRUCCION DE ZAPATAS, DADOS, CONCRETO EN AREA DE ZAPATAS, COLOCADOS LOS POLINES EN COLUMNAS Y TRABES, CONTRAVIENTOS Y EN LA TECHUMBRE CON LAMINA RECTANGULAR SE TIENE UN AVANCE DEL 30 %

EN LA OBRA SE TIENE LA LAMINA PARA TERMINAR CON LA TECHUMBRE, SE UTILIZO EN LA OBRA UN OFICIAL ALBAÑIL, UN OFICIAL SOLDADOR, 3 AYUDANTES DE ALBAÑIL, DOS AYUDANTES DE SOLDADOR, UN OFICIAL PINTOR, DOS PICK UP PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL Y UNA GRUA PARA EL MONTAJE DE POLINERIA.

SE ANEXA FOTOGRAFIAS.

SUPERVISOR DE OBRAS



ING. RAUL RIVERA AMEZQUITA

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

MES DE FEBRERO DEL 2016

CAB- CMCOP-07-2016

FECHA: 15 DE FEBRERO DE 2016

REFERENTE A LAS OBRA: CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA JORGE ALFONSO CORELLA VALLES, EN EJIDO YAQUI JUSTICIERO,BAJO CONTRATO No. CAB-CMCOP-07-2016, DE FECHA 13 DE ENERO DE 2016, SE TIENE EL SIGUIENTE AVANCE DE OBRA:

SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100 % EN LA CONSTRUCCION TOTAL DEL TEJABAN; SE TIENE TERMINADA LA CONSTRUCCION DE ZAPATAS, DADOS, CONCRETO EN AREA DE ZAPATAS, COLOCADOS LOS POLINES EN COLUMNAS Y TRABES, CONTRAVIENTOS Y TECHUMBRE CON LAMINA RECTANGULAR.

SE UTILIZO EN LA OBRA UN OFICIAL ALBAÑIL, UN OFICIAL SOLDADOR, 3 AYUDANTES DE ALBAÑIL, DOS AYUDANTES DE SOLDADOR, UN OFICIAL PINTOR, DOS PICK UP PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL, UNA GRUA PARA EL MONTAJE DE POLINERIA Y HERRAMIENTA MENOR.

SE ANEXA FOTOGRAFIAS.

SUPERVISOR DE OBRAS



ING. RAUL RIVERA AMEZQUITA

AVISO DE INICIO DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA JORGE ALFONSO CORELLA VALLES

LOCALIDAD: EJIDO YAQUI JUSTICIERO

MUNICIPIO: CABORCA

UBICACIÓN DE LA OBRA: EJIDO YAQUI JUSTICIERO

MODALIDAD DE EJECUCIÓN; CONTRATO X ADMINISTRACIÓN DIRECTA _____

CONTRATISTA O DEPENDENCIA RESPONSABLE: C. PEDRO MARTIN GAMEZ UNG

NUMERO DE CONTRATO O ACUERDO: CAB/CMCOP/07/2016

FECHA FIRMA DEL CONTRATO: 13 DE ENERO DEL 2016

FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 13 DE ENERO DEL 2016

FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA: 09 DE MARZO DEL 2016



LIC. LUIS ARTURO ORTEGA DUEÑAS
COORDINADOR DE CMCOP CABORCA



C. PEDRO MARTIN GAMEZ UNG.
CONTRATISTA
