


OBRA: CONSTRUCCION DE TEJABAN EN AREA CIVICA ESCUELA PRIMARIA
 SALVADOR ALVARADO
 LOCALIDAD: EJIDO SANTA EDUVIGES
 MUNICIPIO: H. CABORCA, SON.
 CONTRATO NO. CAB - CMCOP - 08 - 2016

GRAFICA DE OBRA PROGRAMADA

FISICO - FINANCIERO

PORCENTAJE	1 SEMANA	2 SEMANAS	3 SEMANAS	4 SEMANAS	5 SEMANAS	6 SEMANAS	7 SEMANAS	8 SEMANAS
FISICO	5	15	30	45	65	80	95	100
FINANCIERO	30	45	60	70	80	90	95	100

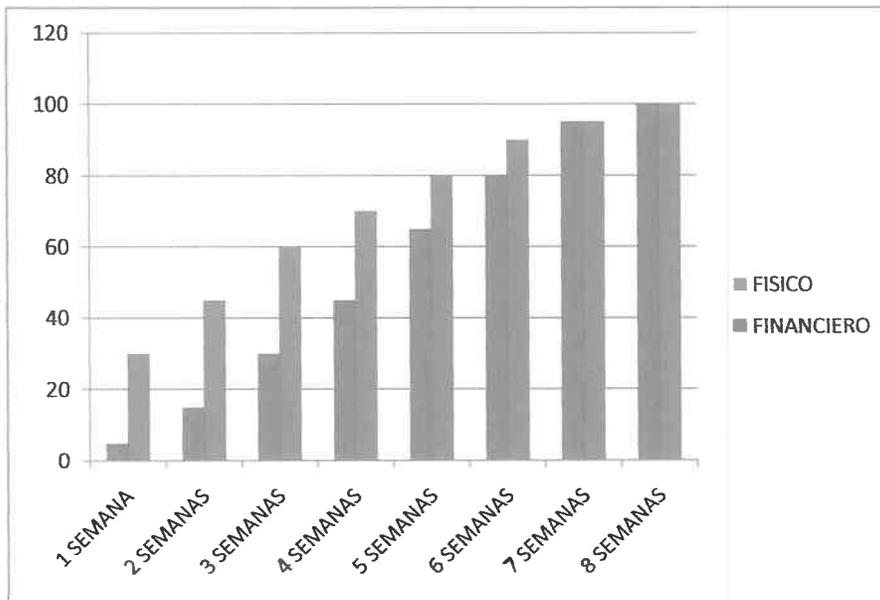


OBRA: CONSTRUCCION DE TEJABAN EN AREA CIVICA ESCUELA PRIMARIA
SALVADOR ALVARADO
LOCALIDAD: EJIDO SANTA EDUVIGES
MUNICIPIO: H. CABORCA, SON.
CONTRATO NO. CAB - CMCOP - 08 - 2016

GRAFICA DE AVANCE REAL

FISICO - FINANCIERO

	2 SEMANAS	4 SEMANAS
FISICO	160,739.12	359,041.50
FINANCIERO	220,229.83	359,041.50

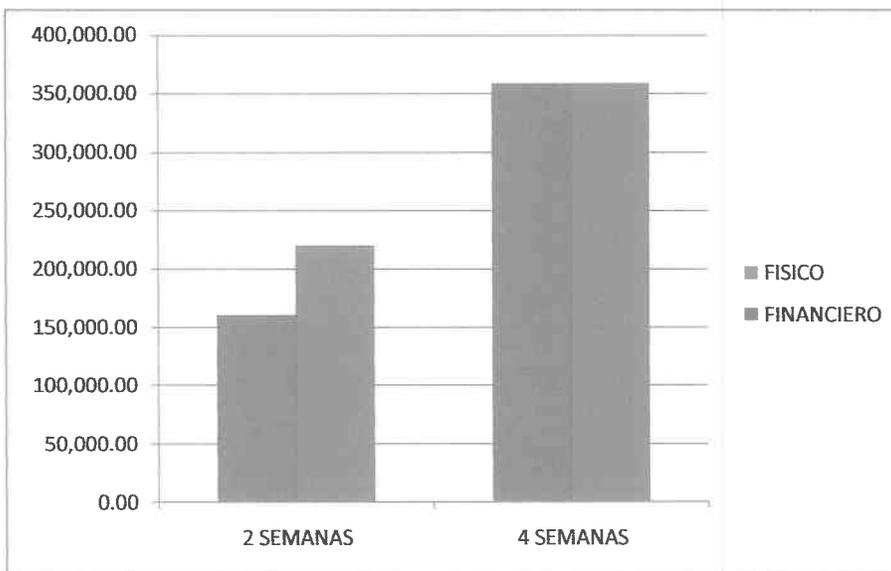

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

MES DE ENERO DEL 2016

CAB- CMCOP-08-2016

FECHA: 01 DE FEBRERO DE 2016

REFERENTE A LAS OBRA: CONSTRUCCION DE TEJABAN EN AREA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO, EN EJIDO SANTA EDUVIGES, BAJO CONTRATO No. CAB-CMCOP-08-2016, DE FECHA 13 DE ENERO DE 2016, SE TIENE EL SIGUIENTE AVANCE DE OBRA:

SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 45% EN LA CONSTRUCCION TOTAL DEL TEJABAN; SE TIENE TERMINADA LA CONSTRUCCION DE ZAPATAS, DADOS, REPOSICION DE LOZA EN AREA DEL TEJABAN, CONSTRUCCION DE MARCO ESTRUCTURAL A BASE DE TUBO MECANICO Y ESTRUCTURA A BASE DE PTR DE 3 PLGS. ARMADO DOBLE, SE TUBO LA NECESIDAD DE RETIRAR CANASTA DE BASKET BOL DE POLINES Y BASE DE CONCRETO

EN LA OBRA SE TIENE LOS POLINES PARA LA TECHUMBRE Y REDONDO LISO PARA CONTRAVIENTO.

SE TRABAJO EN LA OBRA UN OFICIAL ALBAÑIL, UN OFICIAL SOLDADOR, 3 AYUDANTES DE ALBAÑIL, TRES AYUDANTES DE SOLDADOR, UN OFICIAL PINTOR, UN PICK UP PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL Y UNA GRUA PARA EL MONTAJE DE MARCO ESTRUCTURAL Y HERRAMIENTA MENOR.

SE ANEXA FOTOGRAFIAS.

SUPERVISOR DE OBRAS



ING. RAUL RIVERA AMEZQUITA

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

MES DE FEBRERO DEL 2016

CAB- CMCOP-08-2016

FECHA: 15 DE FEBRERO DE 2016


REFERENTE A LAS OBRA: CONSTRUCCION DE TEJABAN EN AREA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO, EN EJIDO SANTA EDUVIGES, BAJO CONTRATO No. CAB-CMCOP-08-2016, DE FECHA 13 DE ENERO DE 2016, SE TIENE EL SIGUIENTE AVANCE DE OBRA:

SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100 % EN LA CONSTRUCCION TOTAL DEL TEJABAN; SE TIENE TERMINADA LA CONSTRUCCION DE ZAPATAS, DADOS, REPOSICION DE LOZA EN AREA DEL TEJABAN, CONSTRUCCION DE MARCO ESTRUCTURAL A BASE DE TUBO MECANICO Y ESTRUCTURA A BASE DE PTR DE 3 PLGS. ARMADO DOBLE, TECHUMBRE A BASE DE POLINES Y LA'MINA GALVANIZADA, Y COLOCACION DE REDONDO LISO PARA CONTRAVIENTO.

SE TRABAJO EN LA OBRA UN OFICIAL ALBAÑIL, UN OFICIAL SOLDADOR, 3 AYUDANTES DE ALBAÑIL, TRES AYUDANTES DE SOLDADOR, UN OFICIAL PINTOR, UN PICK UP PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL Y UNA GRUA PARA EL MONTAJE DE MARCO ESTRUCTURAL Y HERRAMIENTA MENOR.

SE ANEXA FOTOGRAFIAS.

SUPERVISOR DE OBRAS



ING. RAUL RIVERA AMEZQUITA

DICTAMEN

FECHA: 18 DE ENERO DEL 2016


REFERENTE A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TEJABAN EN AREA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO EN EL EJIDO SANTA EDUVIGES, EN H.CABORCA, SON. BAJO CONTRATO No. CAB-CMCOP-08-2016 DE FECHA 13 DE ENERO DEL 2016, QUE TIENE CELEBRADO EL CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA Y EL CONTRATISTA C. JOAQUIN MENDEZ ELIAS , SE EXPRESA LO SIGUIENTE.

EXISTE UNA CANASTA DE BASKET BOL EN EL LUGAR DONDE SE TIENE QUE CONSTRUIR ZAPATA Y DADO DE CONCRETO PARA LA COLOCACION DE TUBO ESTRUCTURAL, PARA LA COLOCACION DE TECHUMBRE DE LAMINA; POR LO TANTO SE TIENE LA NECESIDAD DE RETIRAR LA CANASTA, POLINES, RETIRO DE INSTALACION ELECTRICA Y REMOCION DE CONCRETO EXISTENTE, PARA LA CONSTRUCCION DE ZAPATA Y DADO DE CONCRETO NUEVO.

ESTE CONCEPTO NO FUE CONSIDERADO EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL, PERO ES MUY IMPORTANTE PARA LA CORRECTA EJECUCCION DE LA OBRA.

SE ANEXA FOTOGRAFIAS

SUPERVISOR DE OBRAS



ING. RAUL RIVERA AMEZQUITA

